


工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

2週間作業予定表

今週の実績：基礎捨石①の本均しを行いました。

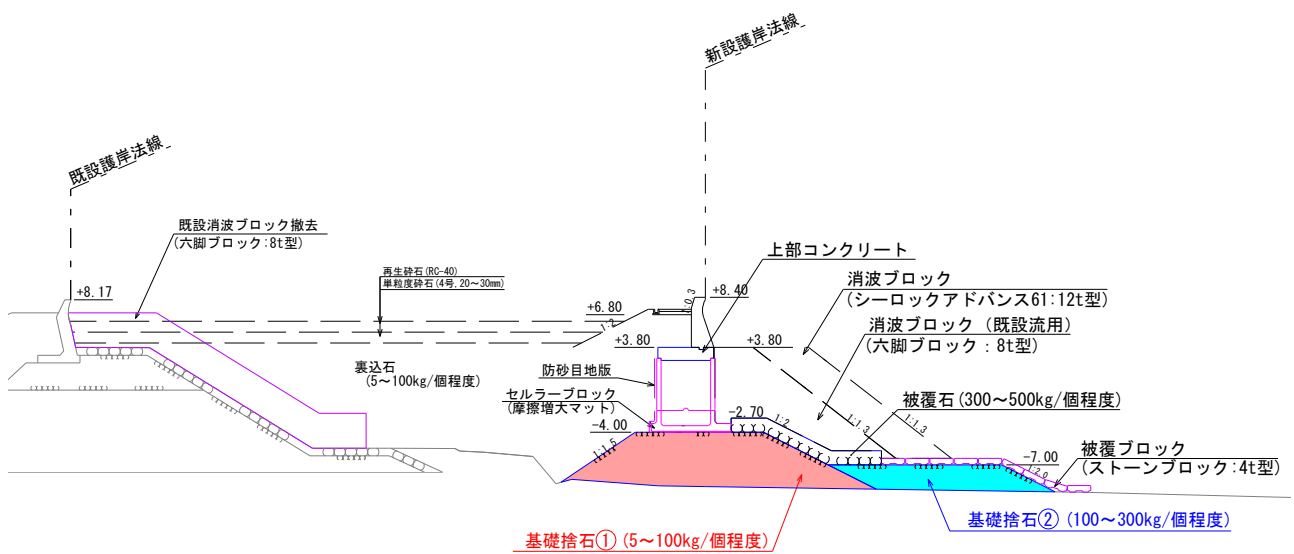

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/1	(月)	基礎捨石②投入 セルラーブロック据付準備	—	7/8	(月)	基礎捨石②荒均し セルラーブロック据付準備	—
7/2	(火)	基礎捨石②荒均し セルラーブロック据付準備	—	7/9	(火)	基礎捨石②荒均し セルラーブロック据付準備	南港
7/3	(水)	基礎捨石②荒均し セルラーブロック据付準備	—	7/10	(水)	セルラーブロック転置 セルラーブロック運搬	南港
7/4	(木)	基礎捨石②荒均し セルラーブロック据付準備	—	7/11	(木)	セルラーブロック据付	南港
7/5	(金)	基礎捨石②荒均し セルラーブロック据付準備	—	7/12	(金)	セルラーブロック据付	南港
7/6	(土)	休工	—	7/13	(土)	休工	南港
7/7	(日)	休工	—	7/14	(日)	休工	南港
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり			備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり		

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-1078)
