
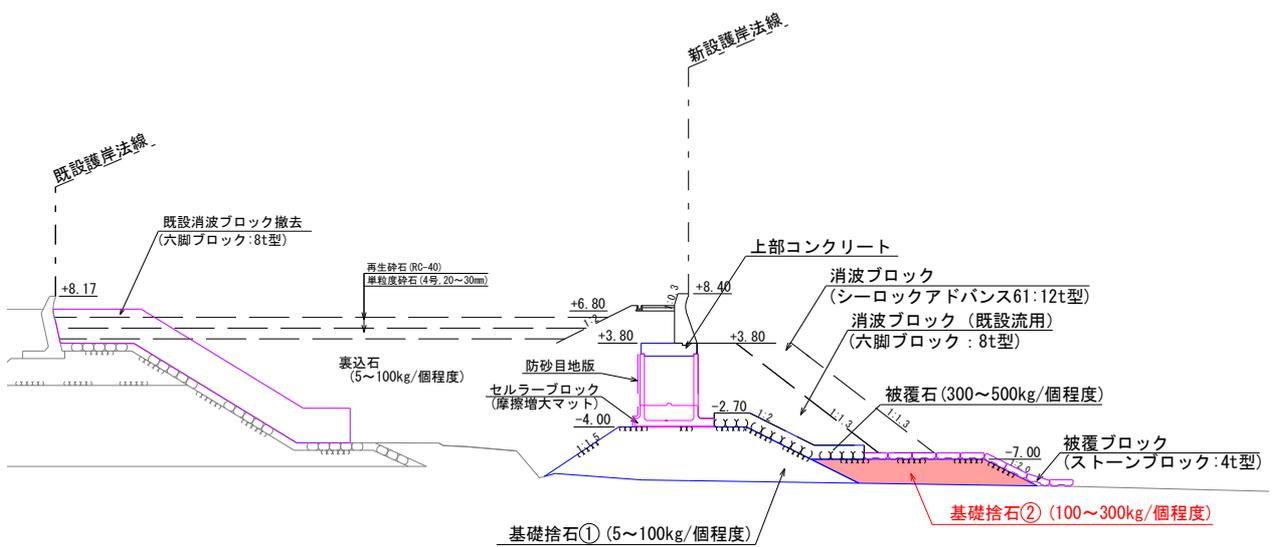


工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

## 2週間作業予定表

今週の実績：基礎捨石②荒均し作業を行いました。

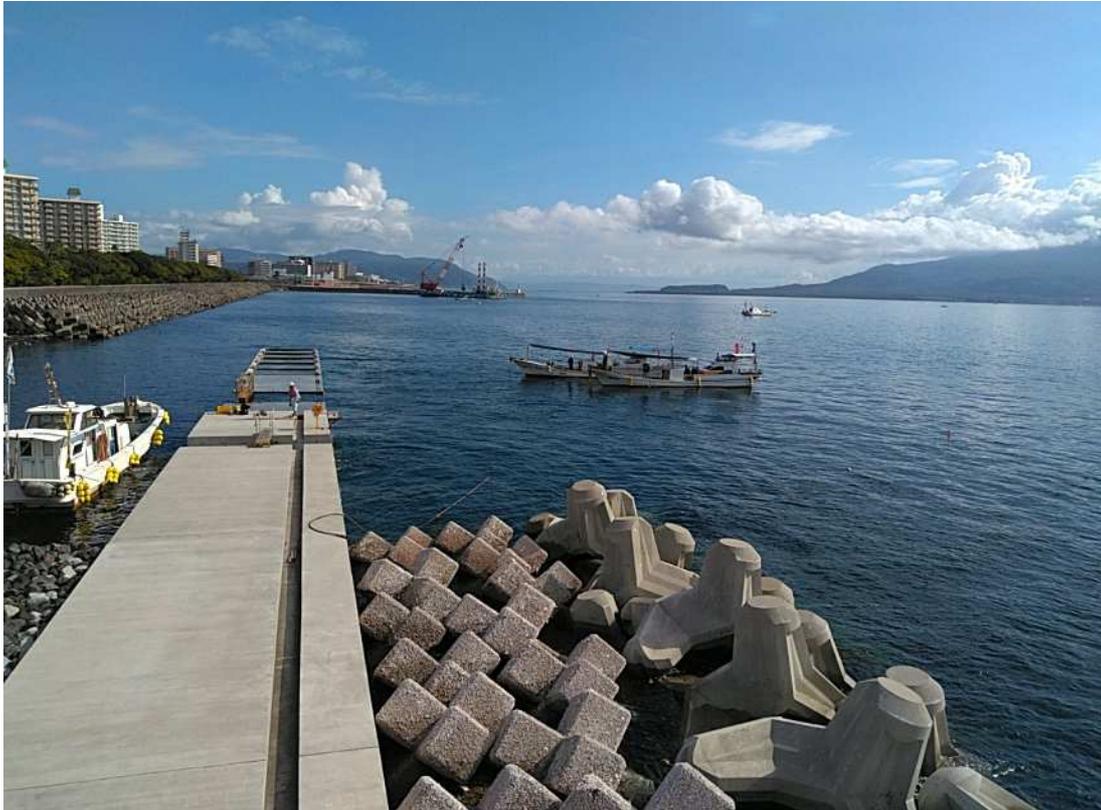

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/26	(月)	基礎捨石②荒均し	—	9/2	(月)	基礎捨石②荒均し	—
8/27	(火)	基礎捨石②荒均し	—	9/3	(火)	基礎捨石②荒均し	—
8/28	(水)	基礎捨石②荒均し	—	9/4	(水)	基礎捨石②荒均し 被覆ブロック据付準備	南港
8/29	(木)	休工	—	9/5	(木)	基礎捨石②荒均し 被覆ブロック据付準備	南港
8/30	(金)	基礎捨石②荒均し	—	9/6	(金)	基礎捨石②荒均し 被覆ブロック据付準備	南港
8/31	(土)	基礎捨石②荒均し	—	9/7	(土)	休工	—
9/1	(日)	休工	—	9/8	(日)	休工	—
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり			備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり		

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-1078)
