


工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

2週間作業予定表

今週の実績：裏込石の投入を行いました。

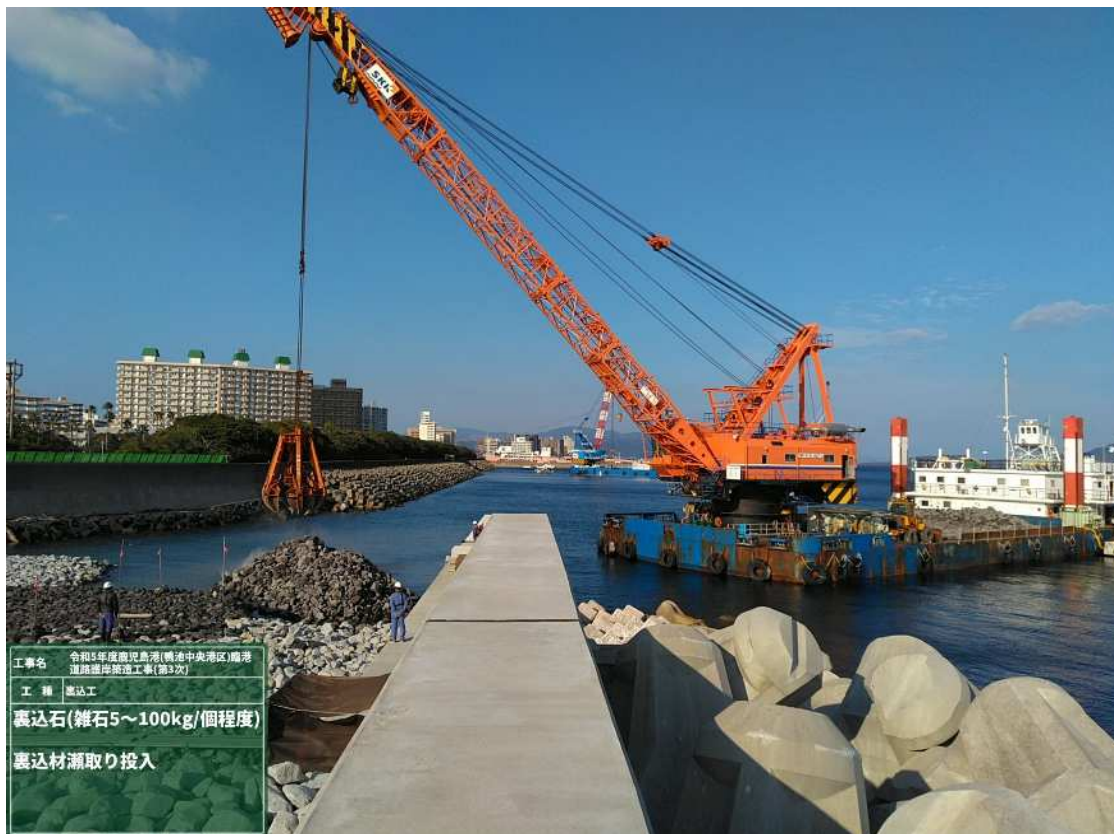

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/2	(月)	裏込石投入	南港	12/9	(月)	裏込石整形	南港
12/3	(火)	裏込石投入	南港	12/10	(火)	裏込石整形	南港
12/4	(水)	裏込石投入	南港	12/11	(水)	裏込石整形	南港
12/5	(木)	裏込石投入	南港	12/12	(木)	裏込石整形	南港
12/6	(金)	裏込石投入	南港	12/13	(金)	消波ブロック据付準備	南港
12/7	(土)	休工	南港	12/14	(土)	休工	南港
12/8	(日)	休工	南港	12/15	(日)	休工	南港
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり			備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり		

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-1078)
