


2週間作業予定表

セルラーブロック据付状況



下段据付状況

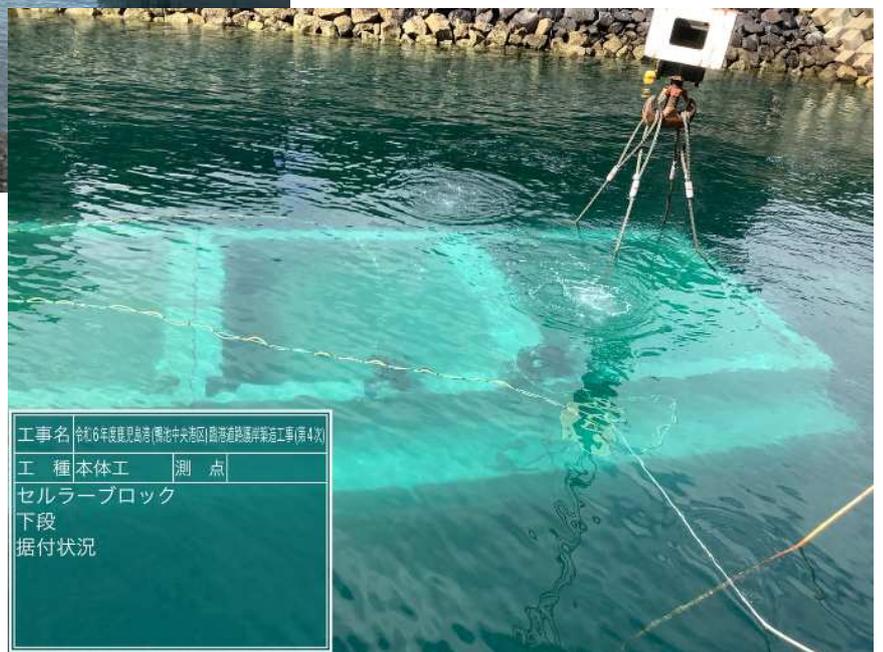

下段据付状況

工事名	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)		
工種	本體工	測	点
セルラーブロック			
下段			
据付状況			

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/2	(月)	中詰材投入・均し	—	12/9	(月)	上部工型枠大組	南港
12/3	(火)	中詰材均し	—	12/10	(火)	上部工型枠大組	南港
12/4	(水)	中詰材均し	—	12/11	(水)	上部工型枠大組・足場設置	南港
12/5	(木)	中詰材均し	南港	12/12	(木)	型枠組立	南港
12/6	(金)	蓋コンクリート打設	南港	12/13	(金)	休工	南港
12/7	(土)	休工	南港	12/14	(土)	型枠組立	南港
12/8	(日)	休工	南港	12/15	(日)	休工	南港

備考

天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。
