


週間作業予定表



仮設工

導杭撤去

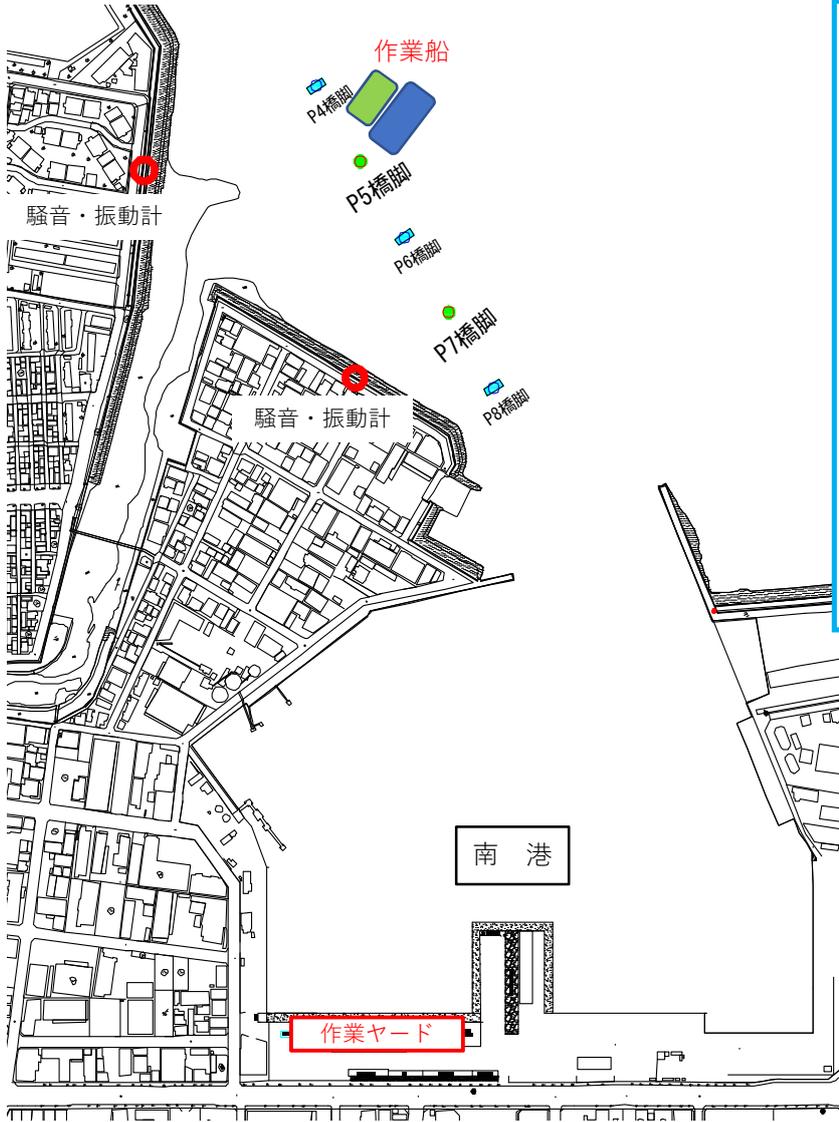

油圧バイプロ(振動作業)を使用し、『鋼管矢板』打ち込みに使用した導杭を撤去します。

騒音・振動計



海上での振動作業に際しては、生活環境に配慮するため、陸上工事の場合に課せられる騒音・振動規制に準拠した作業を実施します。
 騒音規制値:85db以下
 振動規制値:75db以下

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/7	(月)	基礎工：海上作業 測量台撤去(振動作業)・ブラケット溶接	海上(P5)に係留
2/8	(火)	基礎工：海上作業 導杭撤去～作業構台設置(振動作業) ブラケット溶接	海上(P5)に係留
2/9	(水)	基礎工：海上作業 導杭撤去～作業構台設置(振動作業)	海上(P5)に係留
2/10	(木)	基礎工：海上作業 導杭撤去～作業構台設置(振動作業)	海上(P5)に係留
2/11	(金)	お休み	海上(P5)に係留
2/12	(土)	お休み	海上(P5)に係留
2/13	(日)	お休み	海上(P5)に係留
備考		天候により作業内容変更有り	
