


### 週間作業予定表




仮設工

導杭撤去

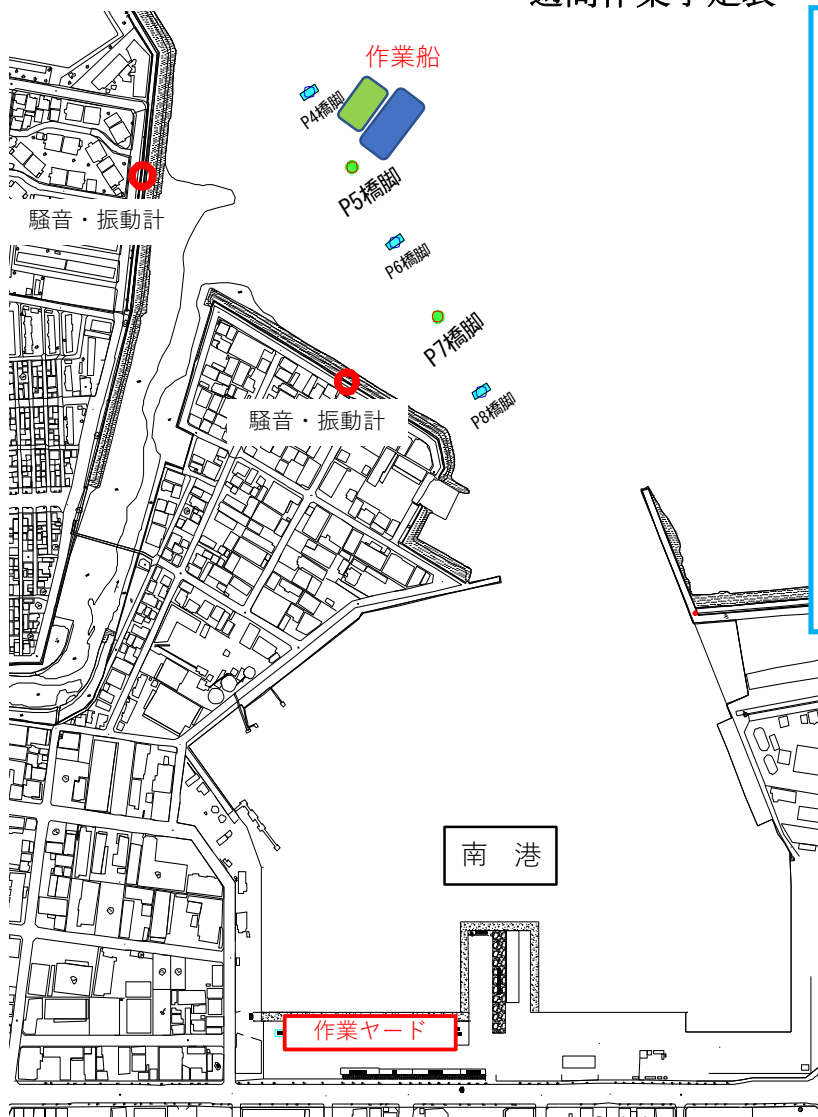

油圧パイプロ(振動作業)を使用し、『鋼管矢板』打ち込みに使用した導杭を撤去します。

騒音・振動計



海上での振動作業に際しては、生活環境に配慮するため、陸上工事の場合に課せられる騒音・振動規制に準拠した作業を実施します。  
 騒音規制値: 85db以下  
 振動規制値: 75db以下

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/14	(月)	基礎工：海上作業 作業構台設置(組立・溶接作業)	海上(P5)に係留
2/15	(火)	基礎工：海上作業 導杭撤去～作業構台設置(振動作業)	海上(P7)に係留
2/16	(水)	基礎工：海上作業 導杭撤去～作業構台設置(振動作業)	海上(P7)に係留
2/17	(木)	基礎工：海上作業 作業構台設置(組立・溶接作業)	海上(P7)に係留
2/18	(金)	基礎工：海上作業 作業構台設置(組立・溶接作業)	海上(P7)に係留
2/19	(土)	お休み	
2/20	(日)	お休み	
備考		作業の進捗及び天候により、作業内容日程に変動はあります。 2/19作業船回航予定、天候により変更有り	
