


2週間作業予定表

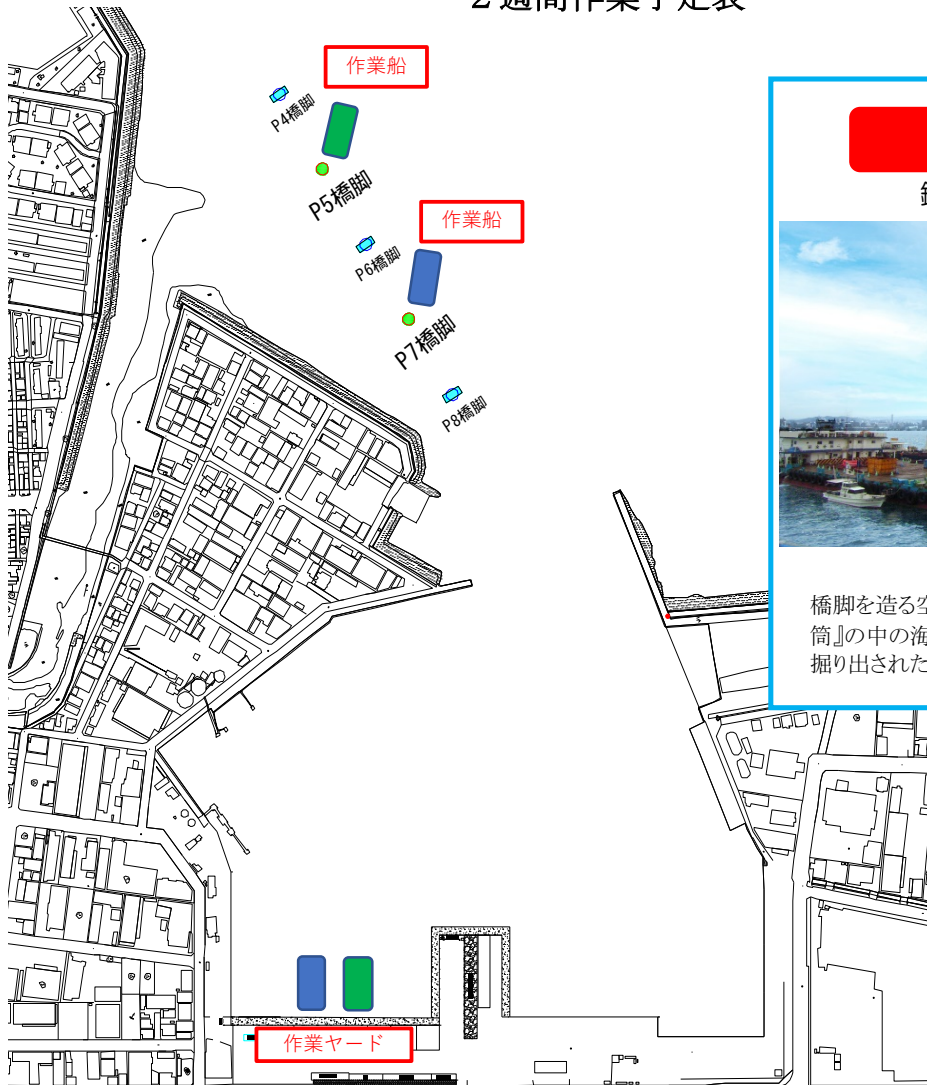

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/21	(月)	お休み	南港に係留	3/28	(月)	P5・7：鋼管矢板継手処理準備 P5：支保工設置	南港に係留 P5係留
3/22	(火)	P5：鋼管矢板内掘削 P5：鋼管矢板内掘削	P5係留⇒南港 P5係留	3/29	(火)	P5・7：鋼管矢板継手処理準備 P5：支保工設置	南港に係留 P5係留
3/23	(水)	P5：鋼管矢板内中詰コンクリート打設 P7：鋼管矢板内中詰コンクリート打設準備	P5係留⇒P7へ P7係留⇒南港	3/30	(水)	P5・7：鋼管矢板継手処理準備 P5：支保工設置	南港に係留 P5係留⇒P7
3/24	(木)	P5：鋼管矢板内中詰コンクリート打設後作業 P7：鋼管矢板内中詰コンクリート打設	P5係留⇒南港 P7係留	3/31	(木)	P5：鋼管矢板継手処理 P7：支保工設置	P5係留⇒南港 P7係留
3/25	(金)	P5：鋼管矢板内中詰コンクリート打設 P7：鋼管矢板内中詰コンクリート打設	P5⇒P7⇒南港 P7⇒P5⇒南港	4/1	(金)	P5：鋼管矢板継手処理 P7：支保工設置	P5係留⇒南港 P7係留⇒南港
3/26	(土)	お休み	南港に係留	4/2	(土)	お休み	南港に係留
3/27	(日)	お休み	南港に係留	4/3	(日)	お休み	南港に係留
備考		天候により作業内容及び係留場所は変更有り		備考		天候により作業内容及び係留場所は変更有り	
