


2週間作業予定表



基礎工

鋼管矢板井筒内掘削

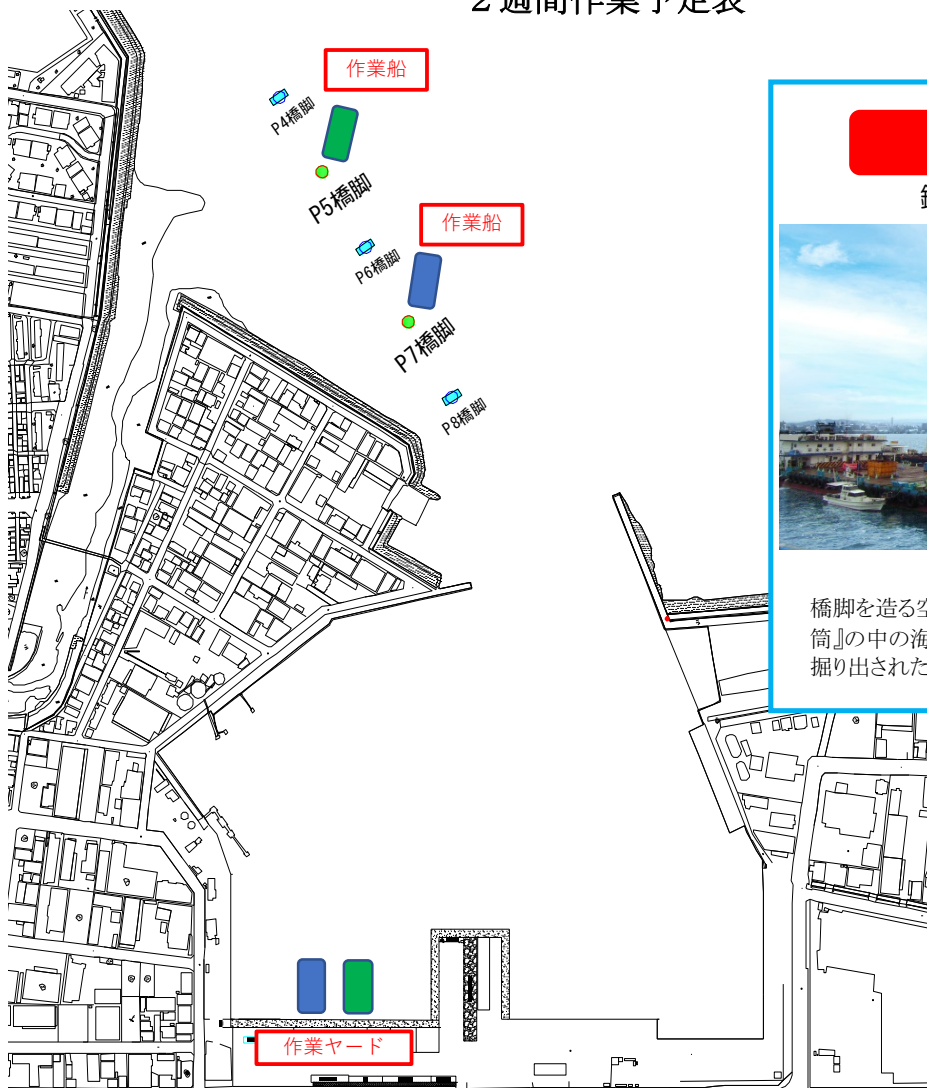

橋脚を造る空間を確保するため、『鋼管矢板井筒』の中の海底を掘り下げます。掘り出された土砂は所定場所に適切に処理します。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
4/18	(月)	P5：支保工設置 P7：鋼管矢板継手処理	P5係留 P7係留⇒南港	4/25	(月)	P5：作業なし P7：支保工設置	P7係留
4/19	(火)	P5：支保工設置 P7：鋼管矢板継手処理	P5係留 P7係留⇒南港	4/26	(火)	P5：作業なし P7：支保工設置	P7係留
4/20	(水)	P5：支保工設置 P7：鋼管矢板継手処理	P5係留 P7係留⇒南港	4/27	(水)	P5：作業なし P7：支保工設置	P7係留
4/21	(木)	P5：支保工設置 P7：鋼管矢板継手処理	P5係留 P7係留⇒南港	4/28	(木)	P5：作業なし P7：支保工設置	P7係留
4/22	(金)	P5：支保工設置 P7：鋼管矢板継手処理	P5係留 P7係留⇒南港	4/29	(金)	お休み	南港に係留
4/23	(土)	お休み	南港に係留	4/30	(土)	お休み	南港に係留
4/24	(日)	お休み	南港に係留	5/1	(日)	お休み	南港に係留
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更有り			備考	天候により作業内容及び係留場所は変更有り (5/8まで現場は休みとします)		
