


2週間作業予定表



基礎工

鋼管矢板井筒内掘削

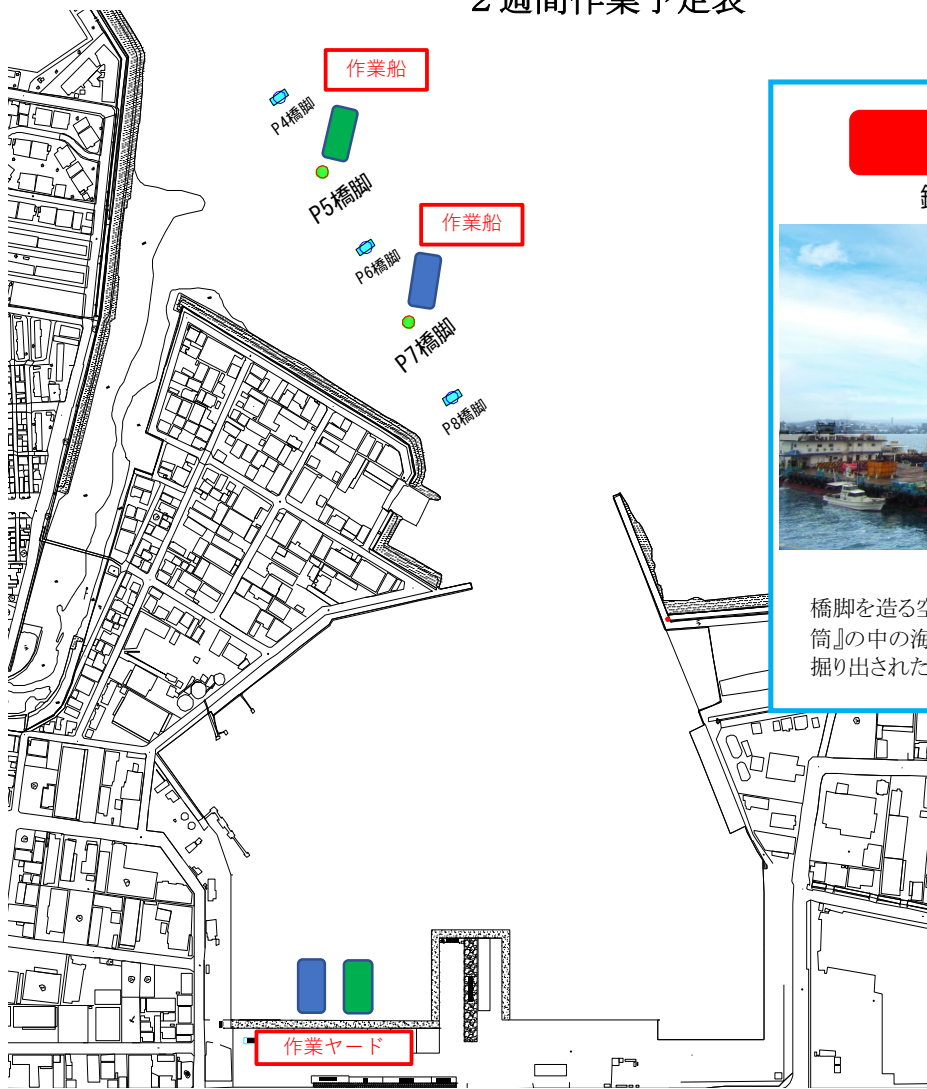

橋脚を造る空間を確保するため、『鋼管矢板井筒』の中の海底を掘り下げます。掘り出された土砂は所定場所に適切に処理します。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/2	(月)	お休み	南港に係留	5/9	(月)	P5：井筒内掘削準備 P7：支保工設置	P5→南港係留 P7係留
5/3	(火)	お休み	南港に係留	5/10	(火)	P5：作業なし P7：支保工設置	P7係留
5/4	(水)	お休み	南港に係留	5/11	(水)	P5：井筒内掘削準備 P7：支保工設置	P7係留
5/5	(木)	お休み	南港に係留	5/12	(木)	P5：井筒内掘削準備 P7：支保工設置	P5係留 P7係留
5/6	(金)	お休み	南港に係留	5/13	(金)	P5：井筒内掘削 P7：支保工設置	P5係留 P7→南港係留
5/7	(土)	お休み	南港に係留	5/14	(土)	お休み	P5係留 南港係留
5/8	(日)	お休み	南港に係留	5/15	(日)	お休み	P5係留 南港係留
備考	GWにより休日とします。			備考	天候により作業内容及び係留場所は変更有り (5/12グラブ船入港予定)		
