


## 2週間作業予定表

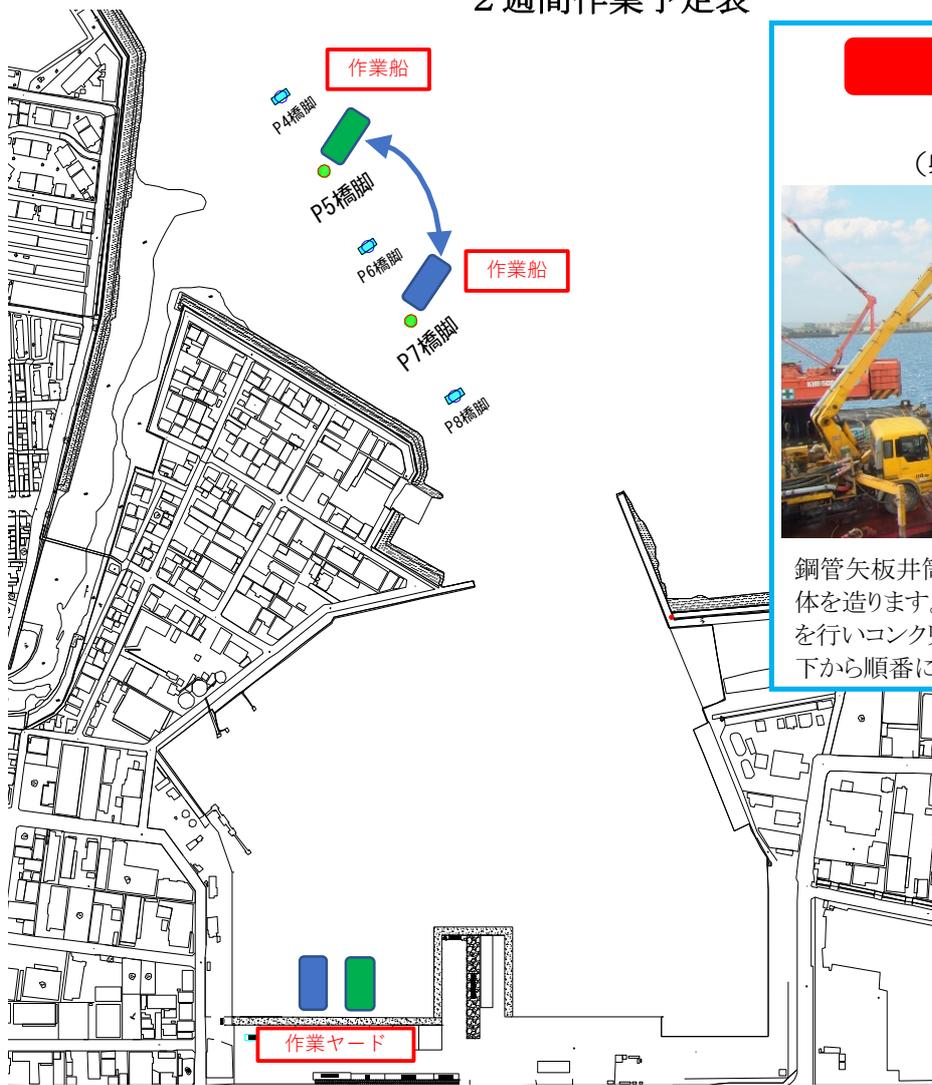

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/25	(月)	P5：底盤調整コン P7：無し	P5係留 P5→南港係留	8/1	(月)	P5：スタッド筋取付 P7：底盤調整コン	P5係留 南港係留
7/26	(火)	P5：養生 P7：スライム処理	P7係留 P7→南港係留	8/2	(火)	P5：スタッド筋取付 P7：底盤調整コン	P5→南港係留 P7係留
7/27	(水)	P5：測量 P7：スライム処理	P7係留 P7→南港係留	8/3	(水)	P5：スタッド筋取付 P7：測量	P5→南港係留 P7係留
7/28	(木)	P5：スタッド筋取付 P7：底盤清掃	P5係留 P7→南港係留	8/4	(木)	P5：頂版鉄筋組立 P7：スタッド筋取付	P5→南港係留 P7係留
7/29	(金)	P5：スタッド筋取付 P7：底盤清掃	P5係留 P7→南港係留	8/5	(金)	P5：頂版鉄筋組立 P7：スタッド筋取付	P5→南港係留 P7→南港係留
7/30	(土)	P5：スタッド筋取付 P7：底盤清掃・測量	P5→南港係留 P7→南港係留	8/6	(土)	お休み	南港係留
7/31	(日)	お休み	南港に係留	8/7	(日)	お休み	南港係留
備考		天候により作業内容及び係留場所は変更有り		備考		天候により作業内容及び係留場所は変更有り	
