


## 2週間作業予定表



### 躯体工

橋脚築造  
(躯体コンクリート打設)

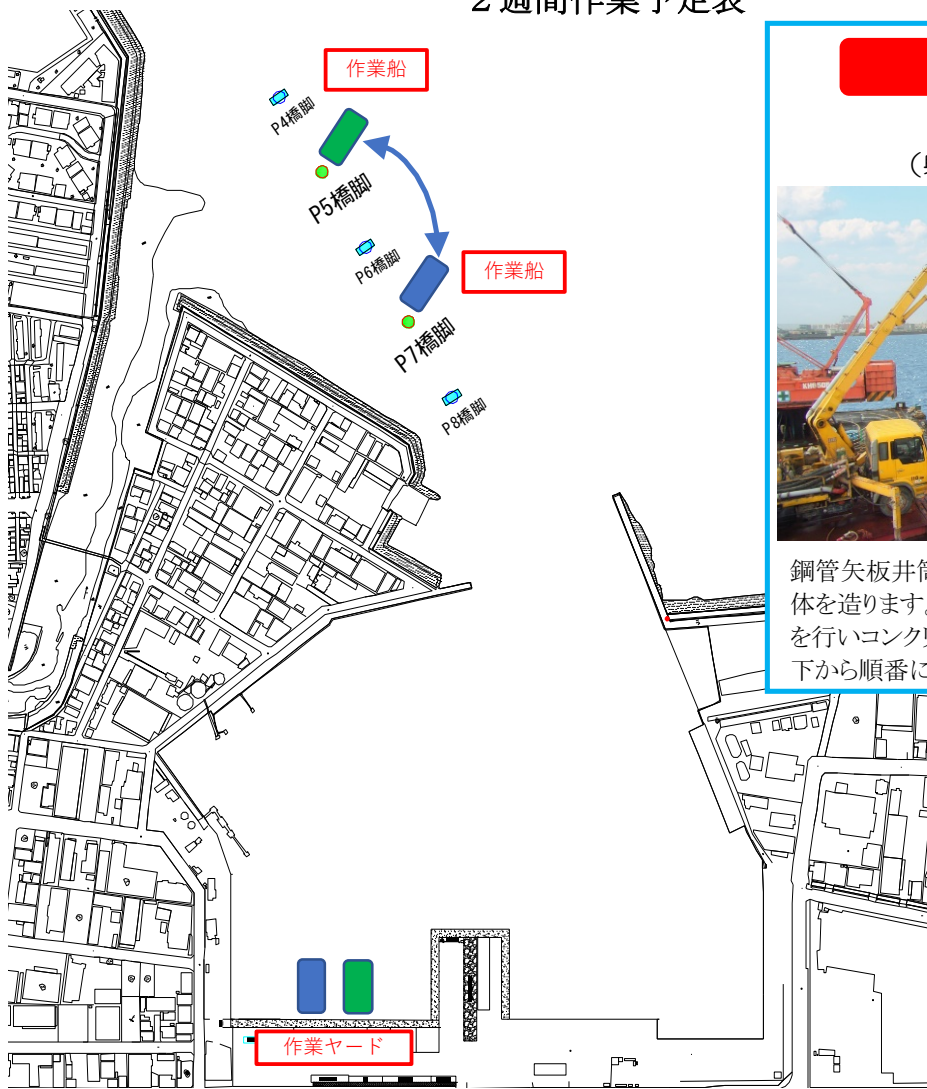

鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/8	(月)	P5：鉄筋組立 P7：スタッド溶接	P5→南港係留 P5係留	8/15	(月)	お休み	南港又は谷山港、旧木材港に係留
8/9	(火)	P5：鉄筋組立 P7：スタッド溶接	P5→南港係留 P5係留	8/16	(火)	お休み	南港又は谷山港、旧木材港に係留
8/10	(水)	P5：鉄筋組立 P7：スタッド溶接	P5→南港係留 P5係留	8/17	(水)	お休み	南港又は谷山港、旧木材港に係留
8/11	(木)	P5：鉄筋組立 P7：スタッド溶接	P5→南港係留 P5係留	8/18	(木)	P5：鉄筋組立 P7：測量	P5→南港係留 P7係留
8/12	(金)	お休み	南港又は谷山港、旧木材港に係留	8/19	(金)	P5：鉄筋組立 P7：鉄筋組立	P5→南港係留 P7→南港係留
8/13	(土)	お休み	南港又は谷山港、旧木材港に係留	8/20	(土)	お休み	南港係留
8/14	(日)	お休み	南港又は谷山港、旧木材港に係留	8/21	(日)	お休み	南港係留
備考		天候により作業内容及び係留場所は変更有り		備考		天候により作業内容及び係留場所は変更有り	
