


2週間作業予定表



躯体工

橋脚築造
(躯体コンクリート打設)

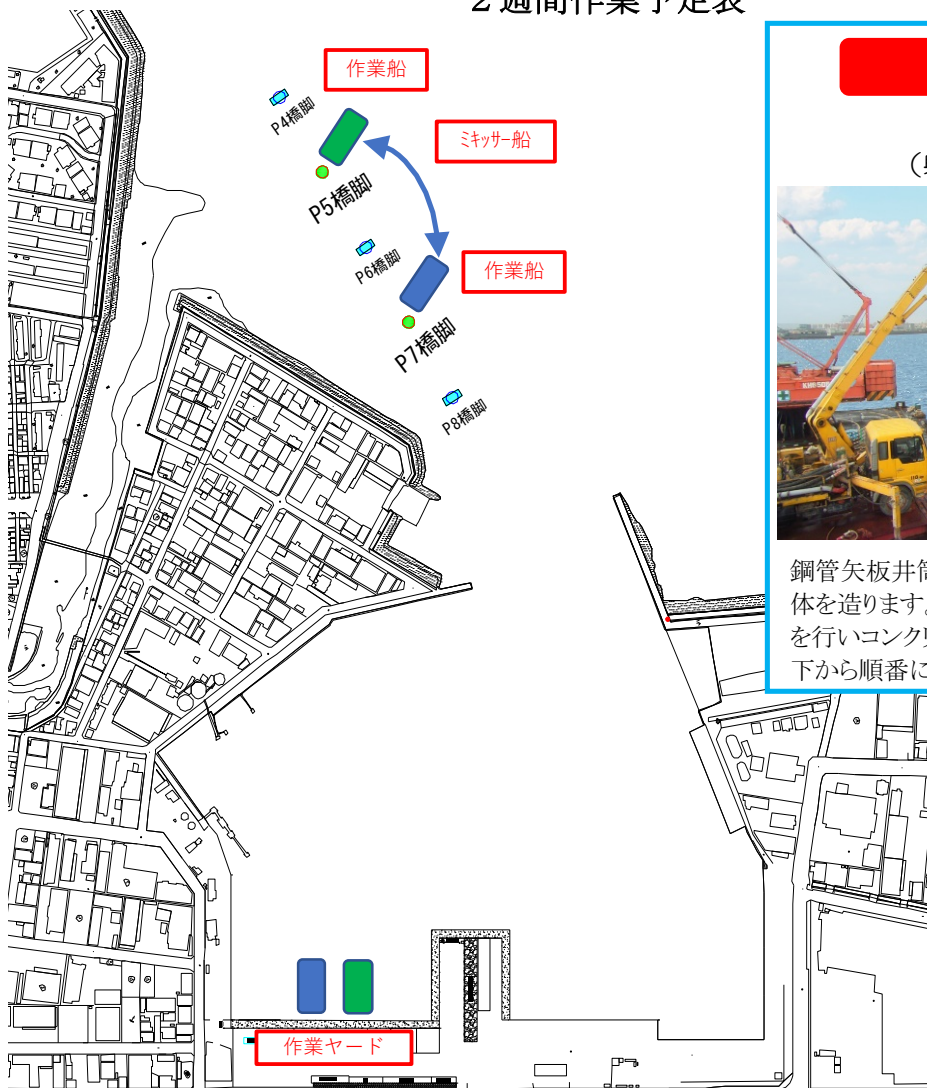

鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。

| 月日 | 曜日 | 作業予定 | 作業船の係留場所 | 月日 | 曜日 | 作業予定 | 作業船の係留場所 |
|------|-----|------------------------------|---------------------|------|-----|--------------------------|--------------------|
| 9/19 | (月) | P5：台風警戒 P7：台風警戒 | 谷山港及び旧木材港避難 | 9/26 | (月) | P5：頂版コン打設準備 P7：足場組替 | P5→南港係留 P7係留 |
| 9/20 | (火) | P5：台風養生復旧 P7：台風養生復旧 | 谷山港及び旧木材港避難 | 9/27 | (火) | P5：頂版コンクリート打設 P7：足場組替 | P5(ミキサー船) P7係留 |
| 9/21 | (水) | P5：頂版鉄筋固め P7：頂版鉄筋固め | P5→南港係留 P7係留 | 9/28 | (水) | P5：頂版コン養生 P7：足場組替 | P5係留 P7→南港係留 |
| 9/22 | (木) | P5：頂版コン打設準備 P7：頂版コンクリート打設 | P5係留 P7係留(ミキサー船) | 9/29 | (木) | 足場組替 P7：柱鉄筋組立 | P5係留 P7→南港係留 |
| 9/23 | (金) | P5：頂版コン打設準備 P7：頂版コン養生 | P5→南港係留 P7→南港係留 | 9/30 | (金) | P5：養生 P7：頂版鉄筋組立 | P5→南港係留 P7→南港係留 |
| 9/24 | (土) | お休み | 南港係留 | 10/1 | (土) | お休み | 南港係留 |
| 9/25 | (日) | お休み | 南港係留 | 10/2 | (日) | お休み | 南港係留 |
| 備考 | | 天候により作業内容・作業日及び係留場所は変更有り | | 備考 | | 天候により作業内容・作業日及び係留場所は変更有り | |
