


工事名：令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

2週間作業予定表

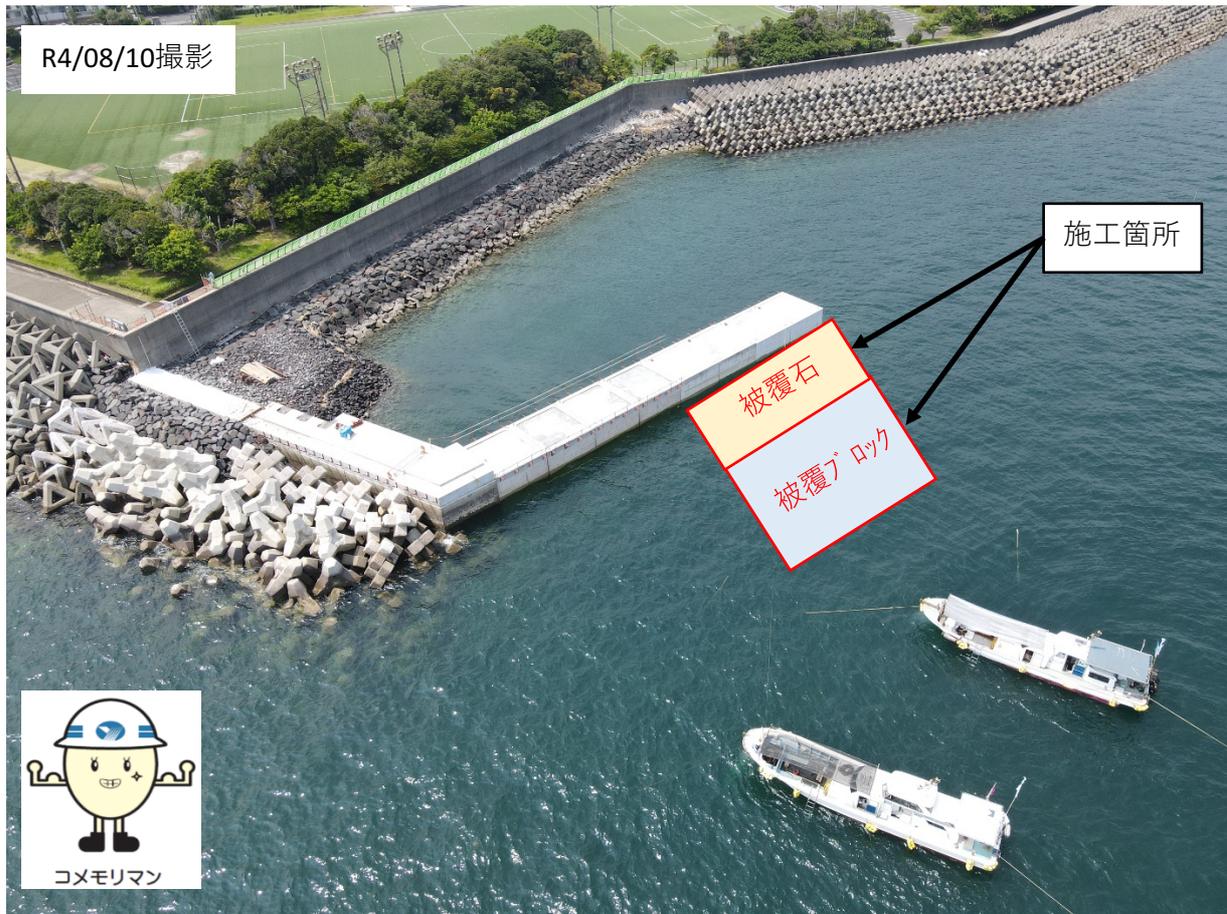

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/5	(月)	台風警戒	—	9/12	(月)	被覆石 投入 (石材船入出)	—
9/6	(火)	台風警戒	—	9/13	(火)	被覆石均し	—
9/7	(水)	被覆ブロック 運搬・積込	—	9/14	(水)	被覆石均し	—
9/8	(木)	被覆ブロック 運搬・据付	谷山港～ 現場内	9/15	(木)	被覆石均し	—
9/9	(金)	被覆ブロック 運搬・据付	現場内～ 谷山港	9/16	(金)	被覆石均し	—
9/10	(土)	休 工	—	9/17	(土)	休 工	—
9/11	(日)	休 工	—	9/18	(日)	休 工	—
備 考	天候により作業内容及び係留場所は変更有り			備 考	天候により作業内容及び係留場所は変更有り		

連絡先：米盛建設(株) (099-203-0676)
