


週間工程表

今週の実績：被覆・根固工 被覆均しと本土工 場所打ちコンクリートを施工しました。

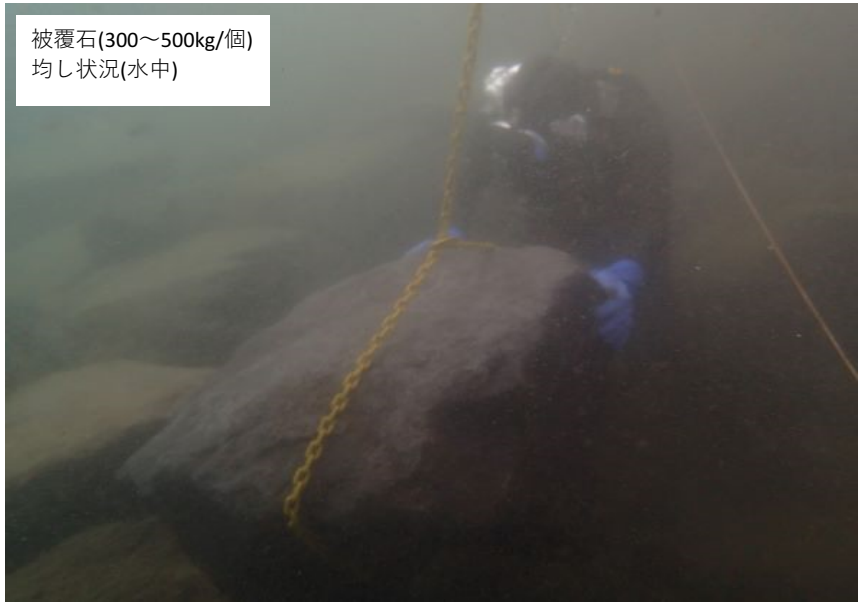

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/17	(月)	上部工 型枠組立 被覆・根固工 被覆均し	南港	10/24	(月)	上部工 コンクリート打設 被覆均し	南港
10/18	(火)	上部工 型枠組立 被覆・根固工 被覆均し	南港	10/25	(火)	上部工 型枠組立 被覆・根固工 被覆均し	南港
10/19	(水)	上部工 型枠組立 被覆・根固工 被覆均し	南港	10/26	(水)	上部工 型枠組立 裏込工 防砂目地板設置	南港
10/20	(木)	上部工 型枠組立 被覆・根固工被覆石投入	南港	10/27	(木)	上部工 型枠組立 裏込工 防砂目地板設置	南港
10/21	(金)	上部工 型枠組立 被覆・根固工 被覆均し	南港	10/28	(金)	上部工 コンクリート打設 裏込工 防砂目地板設置	南港
10/22	(土)	休工	南港	10/29	(土)	休工	南港
10/23	(日)	休工	南港	10/30	(日)	休工	南港
備考	天候により作業内容に変更あり			備考	天候により作業内容に変更あり		
