


## 2週間作業予定表

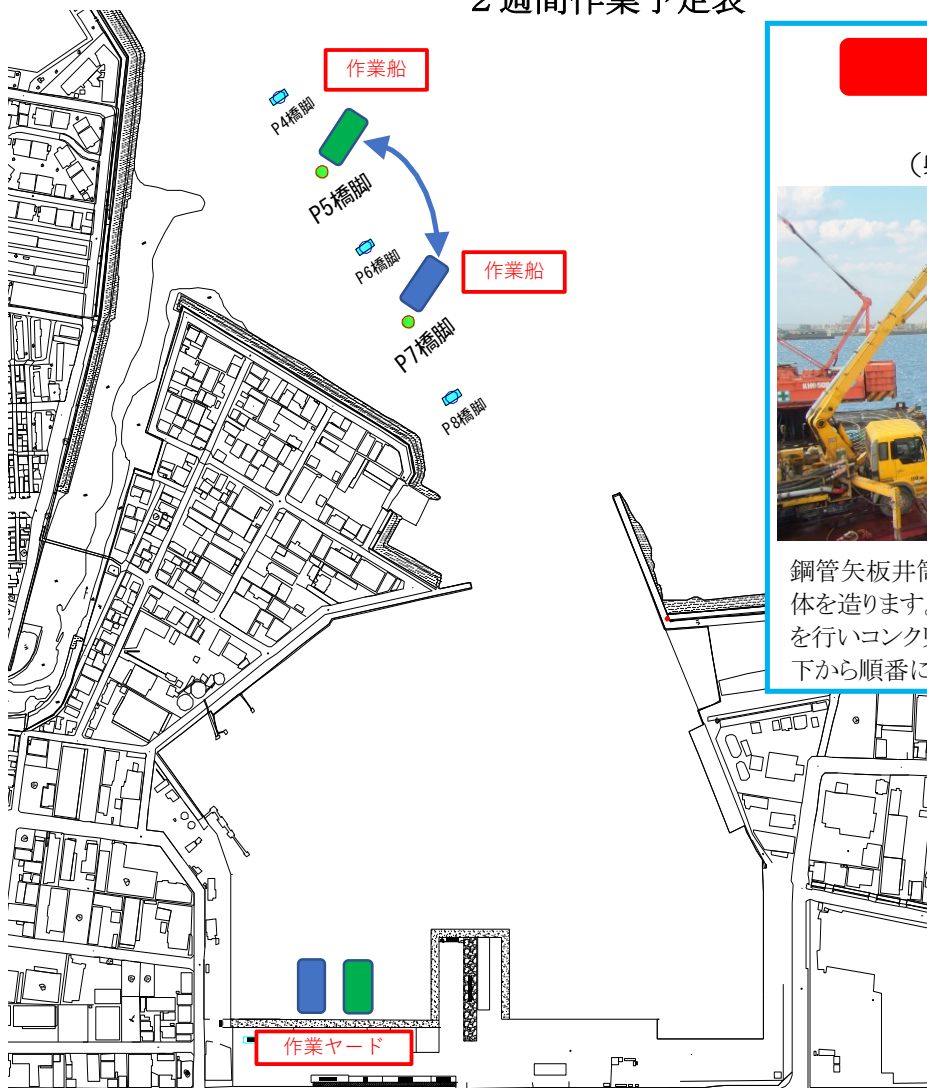

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/28	(月)	P5：柱脱枠(3Lot) P7：柱コン打設準備(3Lot)	P5→南港係留 P7→南港係留	12/5	(月)	P5：底枠組立(梁部) P7：杭一次切断(梁部)	P5係留 P7→南港係留
11/29	(火)	お休み	南港係留	12/6	(火)	P5：底枠組立(梁部) P7：柱脱枠(3Lot)	P5係留 P7→南港係留
11/30	(水)	P5：支保足場組替(梁部) P7：柱コンクリート打設	P5係留 P7→南港係留	12/7	(水)	P5：鉄筋組立(梁部) P7：支保足場組替(梁部)	P5係留 南港係留
12/1	(木)	P5：支保足場組替(梁部) P7：柱レタス処理(3Lot)	P5係留 P7→南港係留	12/8	(木)	P5：鉄筋組立(梁部) P7：支保足場組替(梁部)	P5係留 P7→南港係留
12/2	(金)	P5：底枠組立(梁部) P7：杭一次切断(梁部)	P5係留→南港係留 P7→南港係留	12/9	(金)	P5：鉄筋組立(梁部) P7：底型枠組立(梁部)	P5→南港係留 P7→南港係留
12/3	(土)	お休み	南港係留	12/10	(土)	お休み	南港係留
12/4	(日)	お休み	南港係留	12/11	(日)	お休み	南港係留
備考		天候により作業内容・作業日及び係留場所は変更有り		備考		天候により作業内容・作業日及び係留場所は変更有り	
