


## 週間作業予定表

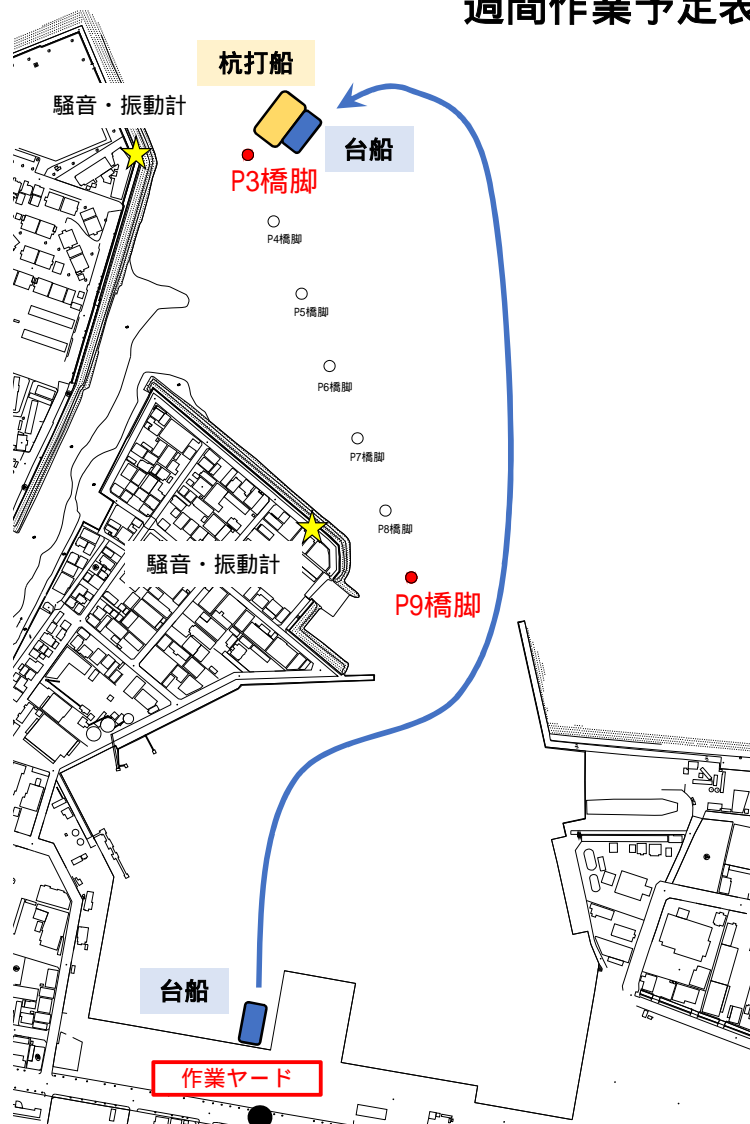

### 仮設工

導杭・導枠設置

導杭・導枠設置は橋脚を支える基礎となる『鋼管矢板』を海底地盤に鉛直に打ち込むための定規を設置します。

### 騒音・振動計

海上での『鋼管矢板』の打ち込みに際しては、生活環境に配慮するため、陸上工事の場合に課せられる騒音・振動規制に準拠した作業を実施します。  
 騒音規制値：85 dB以下  
 振動規制値：75 dB以下

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/5	(月)	AM：作業ヤードにて台船に導杭・導枠材料積込 PM：P3橋脚へ台船移動(現地作業開始) 導杭打込み(振動作業)、受材取付(溶接作業)	海上(P3)に係留
12/6	(火)	仮設工：海上作業 導杭打込み(振動作業)、受材取付(溶接作業)	海上(P3)に係留
12/7	(水)	仮設工：海上作業 導杭打込み(振動作業)、受材取付(溶接作業)	海上(P3)に係留
12/8	(木)	仮設工：海上作業 導枠設置(溶接作業)、歩廊設置(ボルト締め)	海上(P3)に係留
12/9	(金)	仮設工：海上作業 測量台設置、歩廊設置(ボルト締め)	海上(P3)に係留
12/10	(土)	お休み	海上(P3)に係留
12/11	(日)	お休み	海上(P3)に係留
備考			
