


### 3週間作業予定表



## 躯体工

橋脚築造  
(躯体コンクリート打設)

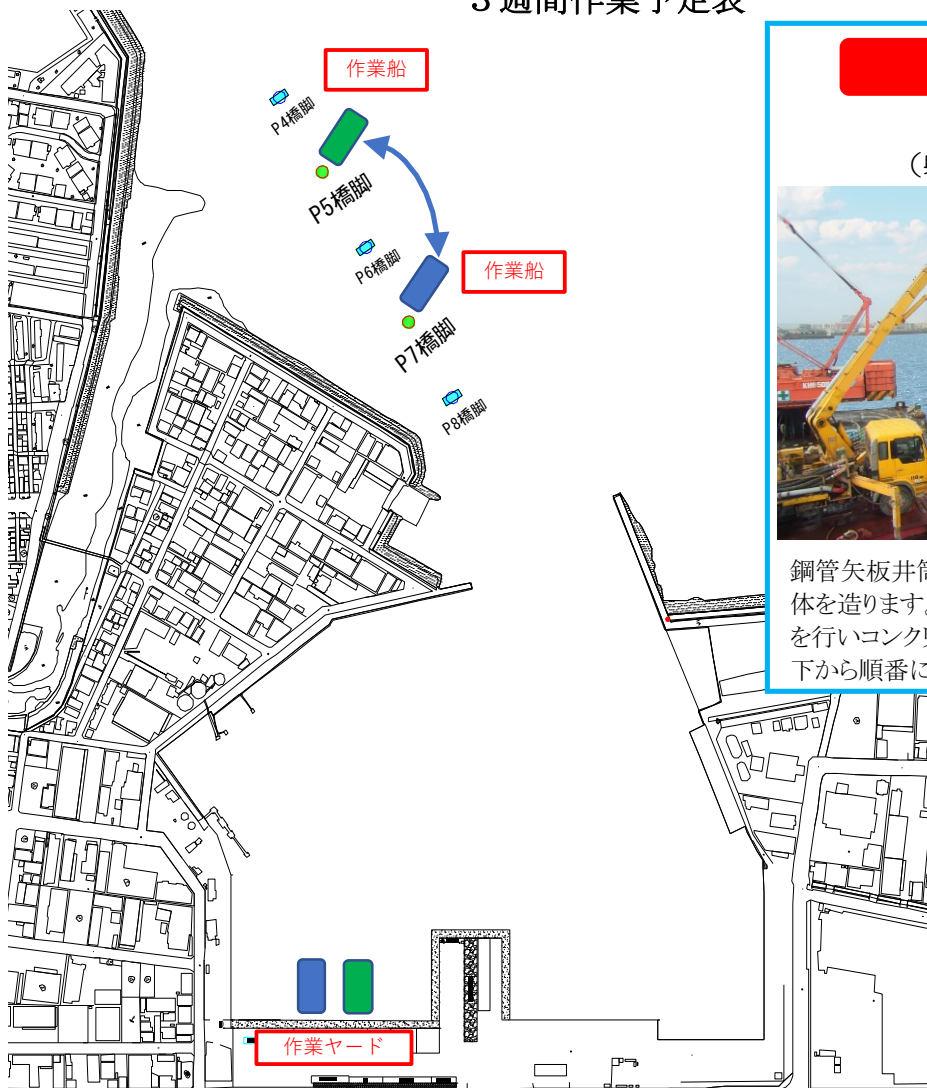

鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/26	(月)	P5：養生(梁部) P7：型枠組立(梁部)	P5係留 P7→南港係留	1/9	(月)	お休み	南港係留
12/27	(火)	P5：養生(梁部) P7：コンクリート打設(梁部)	P5係留 P7→南港係留	1/10	(火)	P5：支承部型枠(梁部) P7：支承部型枠(梁部)	P5係留 P7→南港係留
12/28	(水)	P5：養生(梁部)片付け P7：養生(梁部)片付け	P5係留 P7→南港係留	1/11	(水)	P5：支承部型枠(梁部) P7：支承部型枠(梁部)	P5係留 P7→南港係留
12/29	(木)	お休み	南港係留	1/12	(木)	P5：支承部コン打設(梁部) P7：支承部コン打設(梁部)	P5係留 P7→南港係留
12/30	(金)	お休み	南港係留	1/13	(金)	P5：脱枠(梁部) P7：脱枠(梁部)	P5係留 P7→南港係留
12/31	(土)	お休み	南港係留	1/14	(土)	お休み	南港係留
1/1	(日)	お休み	南港係留	1/15	(日)	お休み	南港係留
備考	1/2～1/8間はお休みとします。			備考	天候により作業内容・作業日及び係留場所は変更有り		
