


週間作業予定表



基礎工

井筒内掘削

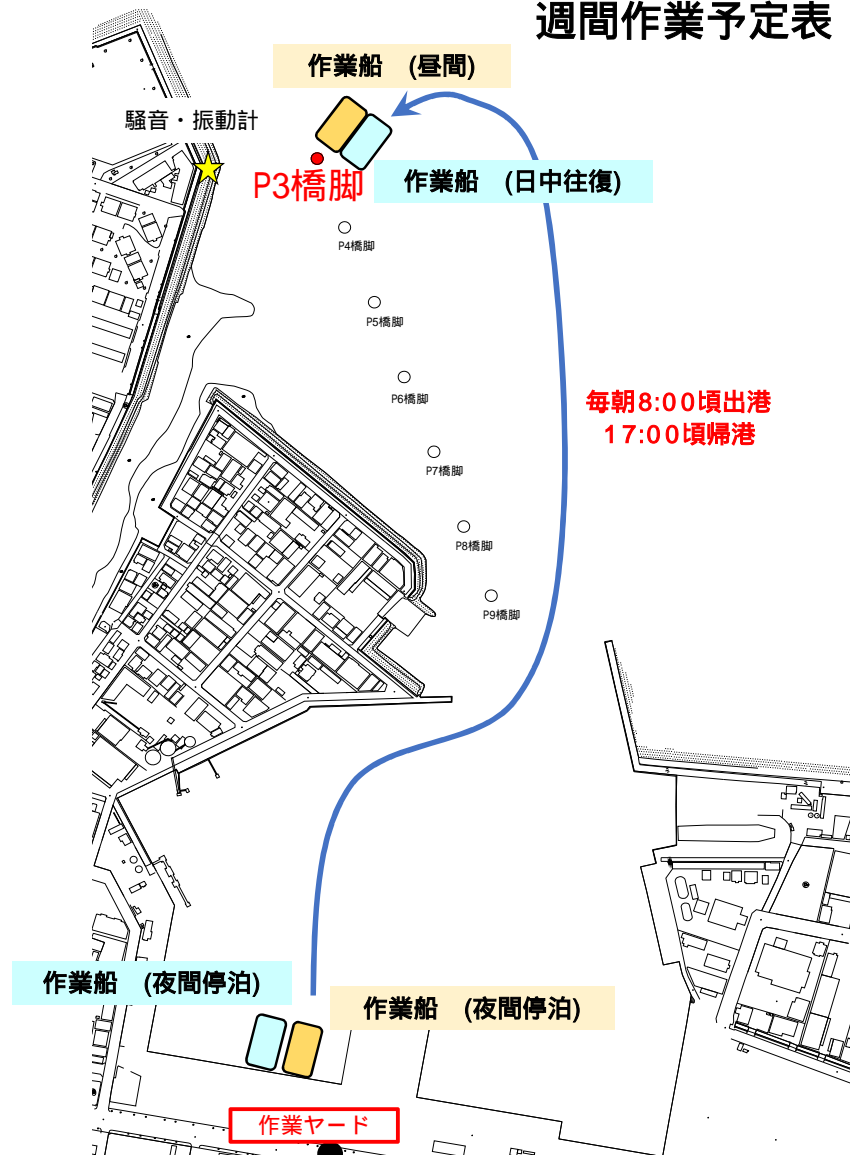

橋脚を造る空間を確保するため、『鋼管矢板井筒』の中の海底を掘り下げます。掘り出された土砂は所定場所に適切に処理します。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/27	(月)	基礎工：海上作業 中詰コンクリート打設段取り	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
2/28	(火)	基礎工：海上作業 中詰コンクリート打設段取り	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
3/1	(水)	基礎工：海上作業 中詰コンクリート打設段取り	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
3/2	(水)	基礎工：海上作業 中詰コンクリート打設 作業船 が南港とP3橋脚間を6往復します。	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
3/3	(金)	基礎工：海上作業 中詰コンクリート打設 作業船 が南港とP3橋脚間を6往復します。	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
3/4	(土)	お休み	南港に係留
3/5	(日)	お休み	南港に係留
備考			
