


## 週間作業予定表



### 基礎工

井筒内掘削

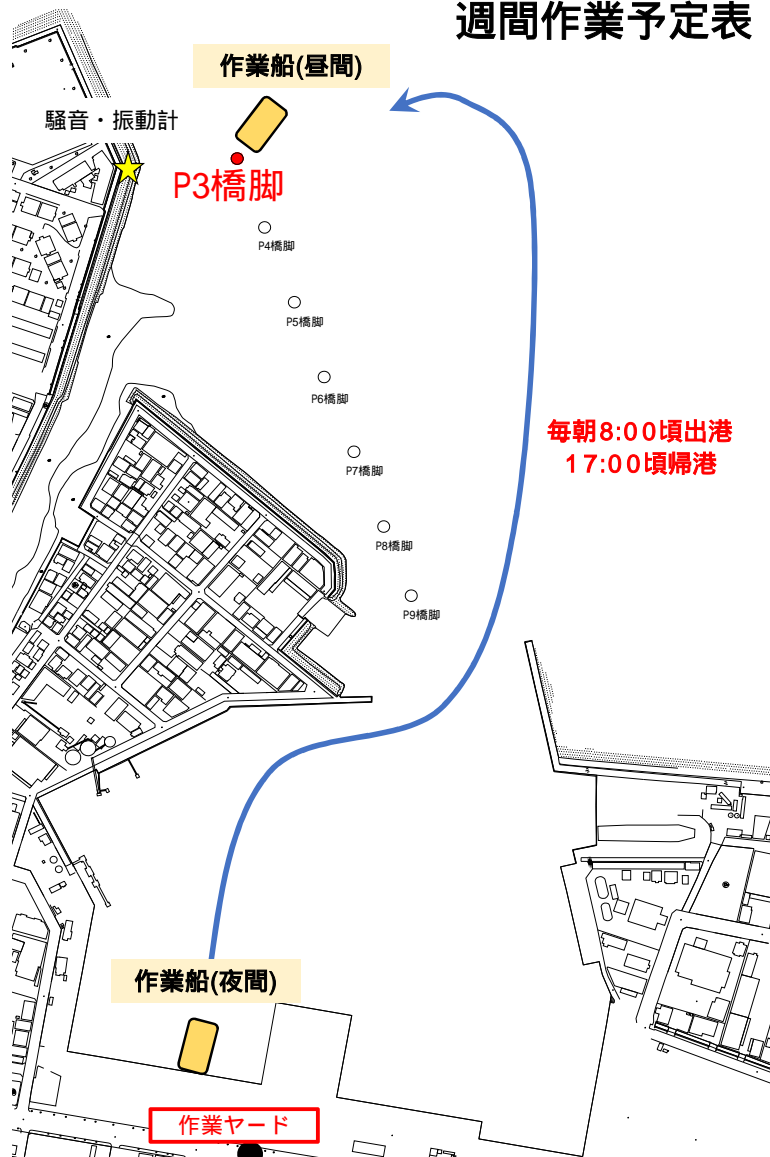

橋脚を造る空間を確保するため、『鋼管矢板井筒』の中の海底を掘り下げます。掘り出された土砂は所定場所に適切に処理します。

### 騒音・振動計



海上での『鋼管矢板』の打ち込みに際しては、生活環境に配慮するため、陸上工事の場合に課せられる騒音・振動規制に準拠した作業を実施します。  
騒音規制値：85 dB以下  
振動規制値：75 dB以下

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/6	(月)	作業無し	南港に係留
2/7	(火)	仮設工：海上作業 仮設構台手摺・渡り設置	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
2/8	(水)	基礎工：海上作業 井筒内掘削作業	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
2/9	(木)	基礎工：海上作業 井筒内掘削作業	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
2/10	(金)	基礎工：海上作業 井筒内掘削作業	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
2/11	(土)	お休み	南港に係留
2/12	(日)	お休み	南港に係留
備考			
