


週間作業予定表



基礎工

底盤コンクリート打設・井筒内排水

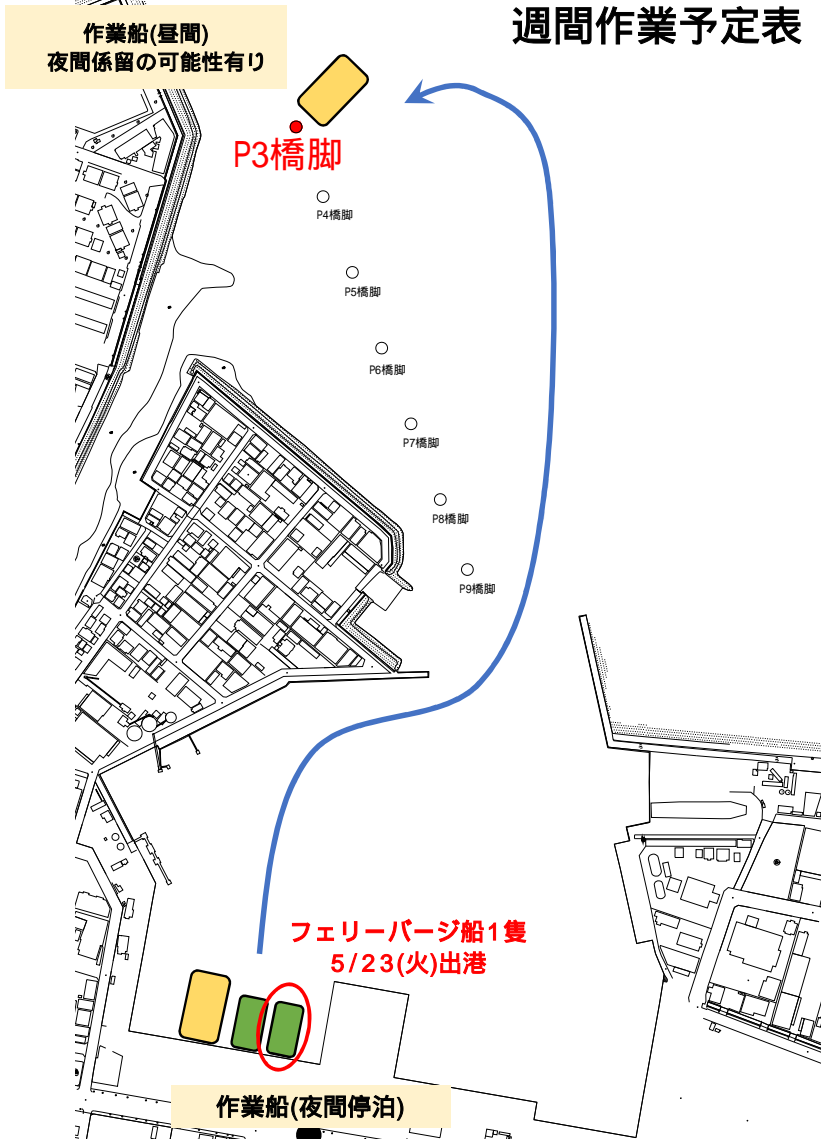

井筒内掘削が完了したら、井筒の底から水が湧き出てくるのを塞ぐ蓋の役割を果たす底盤コンクリートを打設します。その後、井筒内の海水を全て抜き、空洞にします。



支保工リング取付状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/22	(月)	仮設工：海上作業 支保工リング取付段取り(4段目)	海上(P3)に係留
5/23	(火)	仮設工：海上作業 支保工リング取付(4段目)、底枠組立(4段目)	海上(P3)に係留
5/24	(水)	仮設工：海上作業 間詰コンクリート打設(4段目)	海上(P3)に係留
5/25	(水)	仮設工：海上作業 支保工リング取付段取り(5段目)	海上(P3)に係留
5/26	(金)	仮設工：海上作業 支保工リング取付(5段目)、底枠組立(5段目)	海上(P3)に係留
5/27	(土)	お休み	南港に係留
5/28	(日)	お休み	南港に係留
備考			
