


週間作業予定表



基礎工

底盤コンクリート打設・井筒内排水

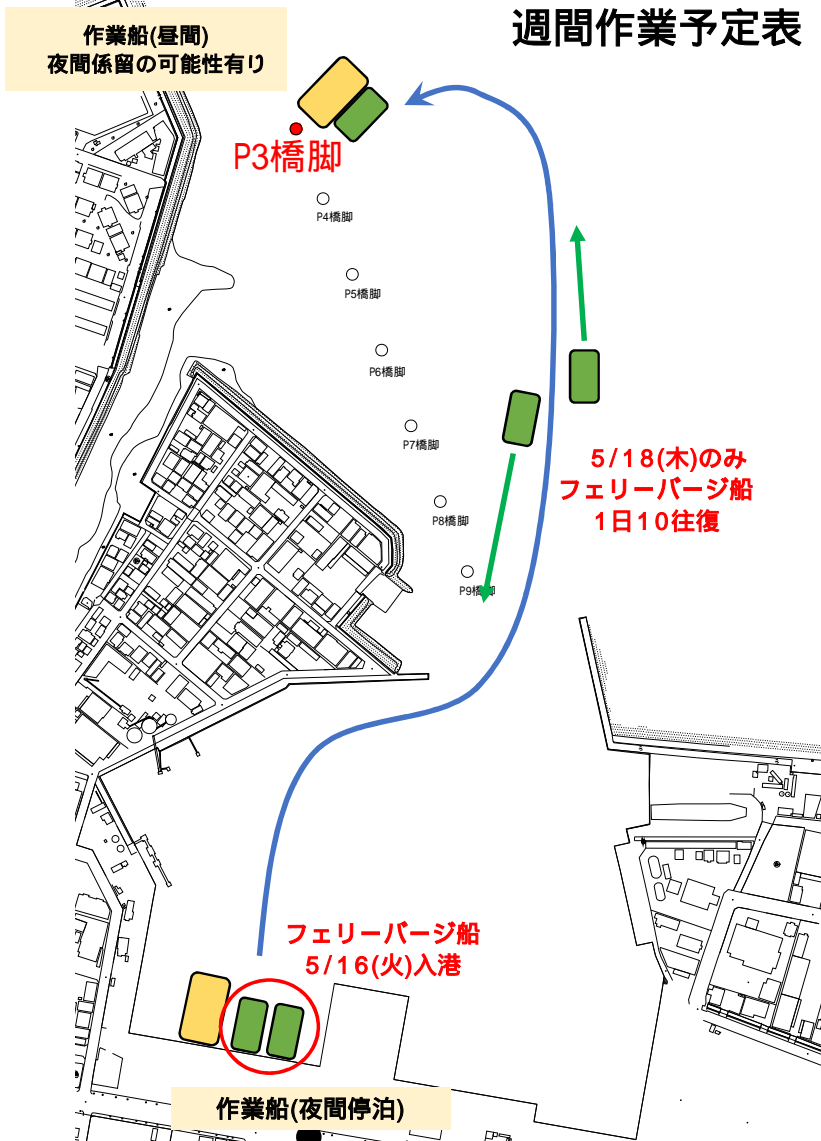

井筒内掘削が完了したら、井筒の底から水が湧き出てくるのを塞ぐ蓋の役割を果たす底盤コンクリートを打設します。その後、井筒内の海水を全て抜き、空洞にします。

敷き砂投入状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/15	(月)	基礎工：海上作業 減圧装置設置	海上(P3)に係留
5/16	(火)	基礎工：海上作業 敷き砂敷均し AMフェリーバージ船2隻入港	海上(P3)に係留
5/17	(水)	基礎工：海上作業 敷き砂敷均し	海上(P3)に係留
5/18	(水)	基礎工：海上作業 底盤コンクリート打設	海上(P3)に係留
5/19	(金)	基礎工：海上作業 支保工取付段取り	海上(P3)に係留
5/20	(土)	お休み	南港に係留
5/21	(日)	お休み	南港に係留
備考		5/18の底盤コンクリート打設はフェリーバージ船2隻が南港とP3橋脚間をそれぞれ5往復(合計10往復)します。	
