


2週間作業予定表

工事名:令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者:りんかい日産建設株式会社

鹿児島港作業所TEL:099-297-5318

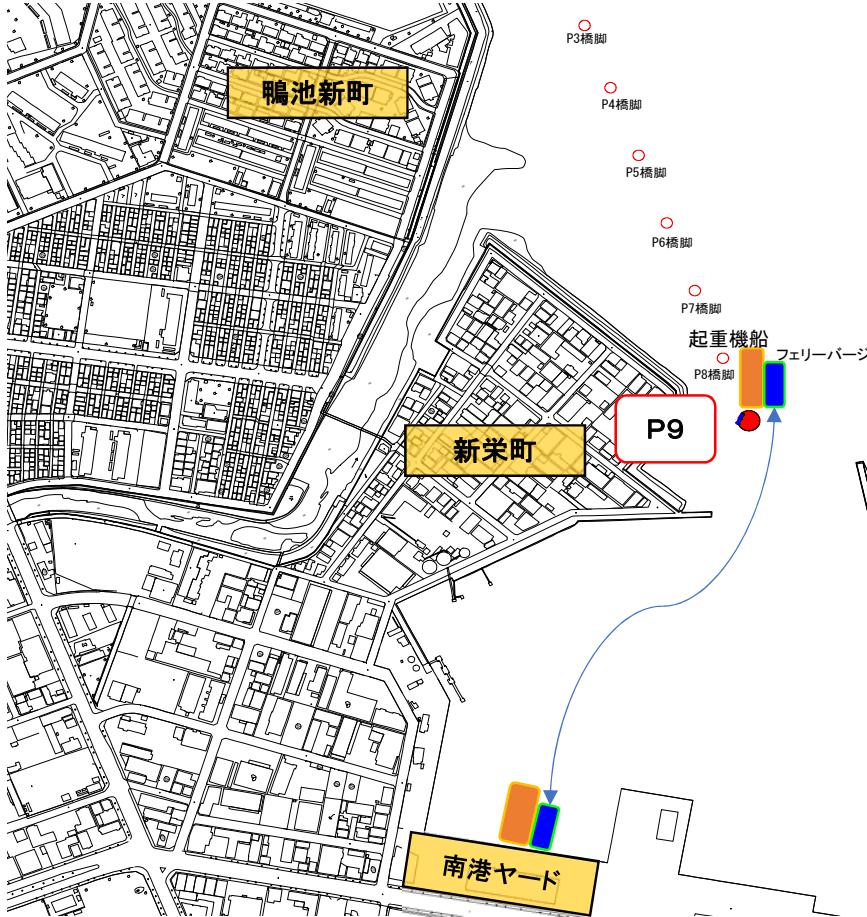

基礎工

底盤コンクリート打設



- ・17日に井筒内へ底盤コンクリートを打設し、底の蓋をします。
- ・打設当日はフェリーバージが南港を7往復します。
- ・打設後は井筒内の水位を下げながら支保工を設置し水圧・土圧による井筒の倒壊を防ぎます。

使用船舶
 【起重機船】120t吊
 【起重機船】55t吊
 【台船】800t積



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/15	(月)	濁水処理施設組立 敷砂投入・均し	南港 P9	5月22日	(月)	支保工設置(4段目) 間詰コンクリート打設(4段目)	P9
5/16	(火)	濁水処理施設組立	南港	5月23日	(火)	支保工設置準備(5段目)	P9
5/17	(水)	底盤コンクリート打設	南港 P9	5月24日	(水)	支保工設置(5段目)	P9
5/18	(木)	支保工設置準備		5月25日	(木)	支保工設置(5段目)	P9
5/19	(金)	支保工設置(4段目)	P9	5月26日	(金)	間詰コンクリート打設(5段目)	P9
5/20	(土)			5月27日	(土)	休工	
5/21	(日)			5月28日	(日)	休工	
備考		17日は底盤コンクリート打設です。 終日フェリーバージが南港とP9を7往復します。		備考			
