


2週間作業予定表

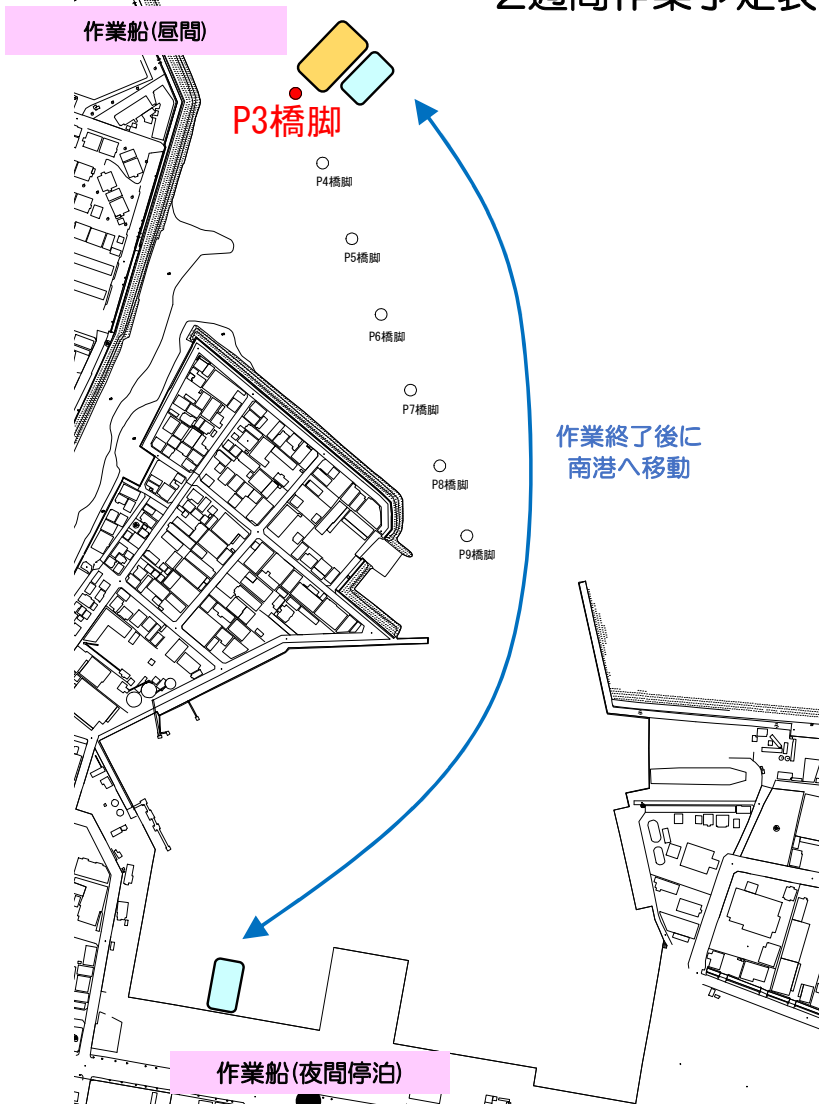

躯体工
橋脚築造
(躯体コンクリート打設)

鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。

頂版打設状況

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/21	(月)	躯体工：海上作業 頂版鉄筋修正	P3	8/28	(月)	躯体工：海上作業 測量	P3
8/22	(火)	躯体工：海上作業 頂版コン打設準備	P3	8/29	(火)	躯体工：海上作業 測量	P3
8/23	(水)	躯体工：海上作業 頂版コン打設	P3	8/30	(水)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3
8/24	(水)	躯体工：海上作業 レイタンス処理	P3	8/31	(水)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3
8/25	(金)	躯体工：海上作業 柱筋受け鋼材撤去	P3	9/1	(金)	躯体工：海上作業 柱鉄筋組立	P3
8/26	(土)	躯体工：海上作業 外周足場組立	P3	9/2	(土)	お休み	南港
8/27	(日)	お休み	南港	9/3	(日)	お休み	南港
備考							
