


工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

【2週間作業予定表】

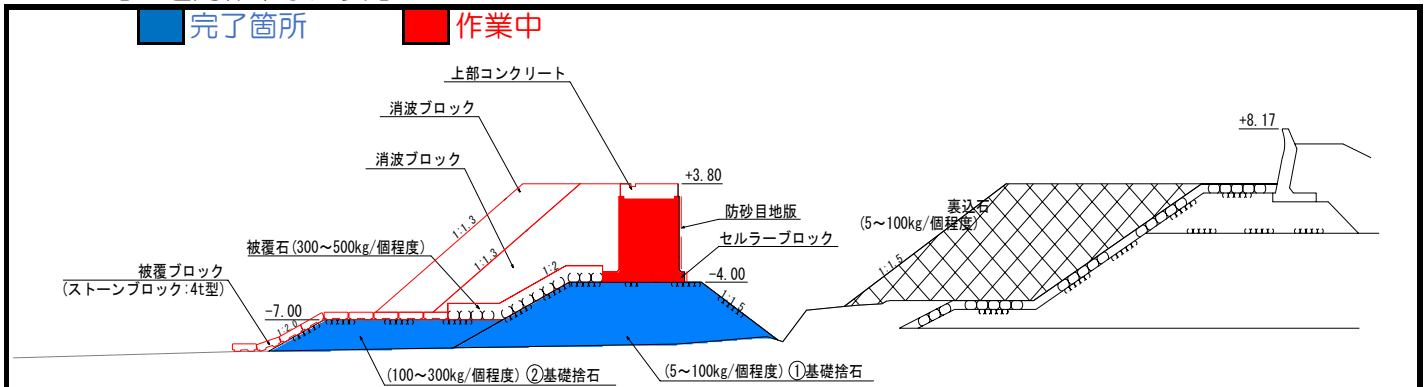

日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
10月9日	月	休工	10月16日	月	本體工 中詰材投入
10月10日	火	本體工 セルラーブロック積込	10月17日	火	本體工 中詰材均し
10月11日	水	本體工 セルラーブロック据付	10月18日	水	上部工 蓋コンクリート打設
10月12日	木	本體工 セルラーブロック据付	10月19日	木	上部工 型枠組立準備
10月13日	金	本體工 据付出来形確認検査	10月20日	金	休工 (振替休日10/14作業)
10月14日	土	本體工 中詰材投入	10月21日	土	休工
10月15日	日	休工	10月22日	日	休工

※天候・隣接工区との調整等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。

備考
