


2週間作業予定表

作業船(昼間作業、夜間停泊)

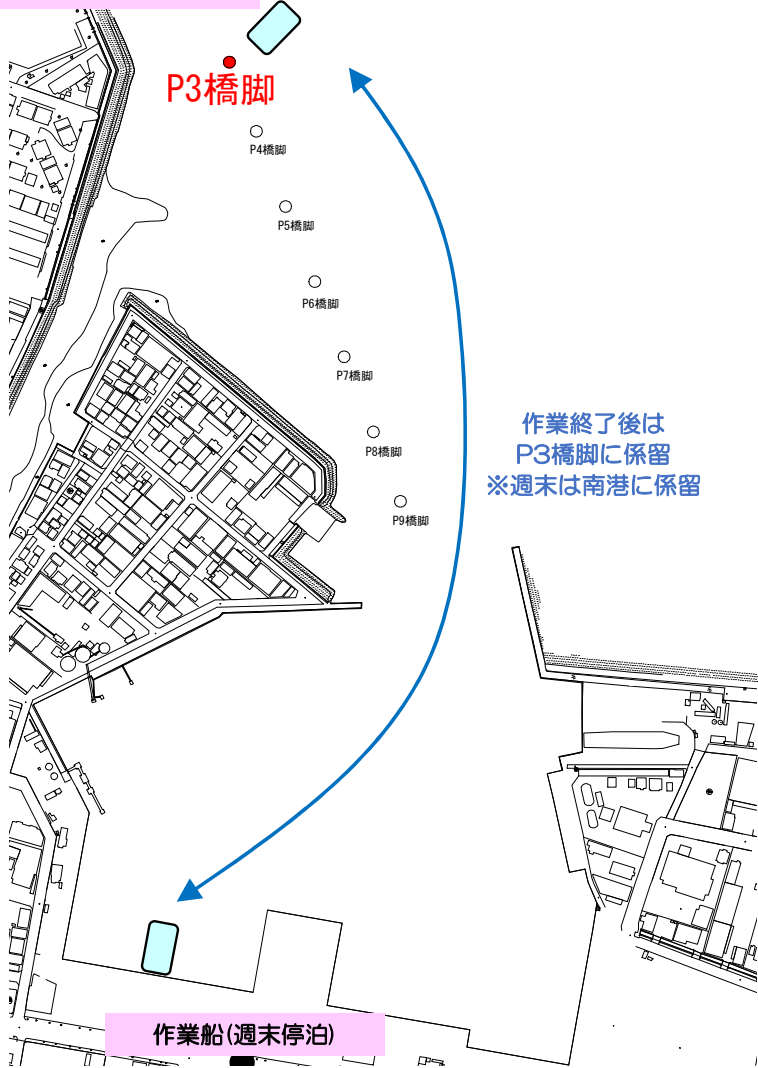

躯体工

橋脚築造
(躯体コンクリート打設)



鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及びび型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。



梁コンクリート打設状況



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/11	(月)	躯体工：海上作業 足場一部解体	P3	12/18	(月)	躯体工：海上作業 躯体出来形検査	P3
12/12	(火)	躯体工：海上作業 梁底枠脱枠	P3	12/19	(火)	躯体工：海上作業 足場撤去	P3
12/13	(水)	躯体工：海上作業 躯体美装	P3	12/20	(水)	躯体工：海上作業 足場撤去	P3
12/14	(木)	躯体工：海上作業 点検梯子・手摺設置	P3	12/21	(木)	躯体工：海上作業 支保工撤去6段目	P3
12/15	(金)	躯体工：海上作業 躯体出来形検査	P3	12/22	(金)	躯体工：海上作業 支保工撤去6段目	P3
12/16	(土)	お休み	南港	12/23	(土)	お休み	南港
12/17	(日)	お休み	南港	12/24	(日)	お休み	南港
備考							
