


工事名：令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

## 2週間作業予定表

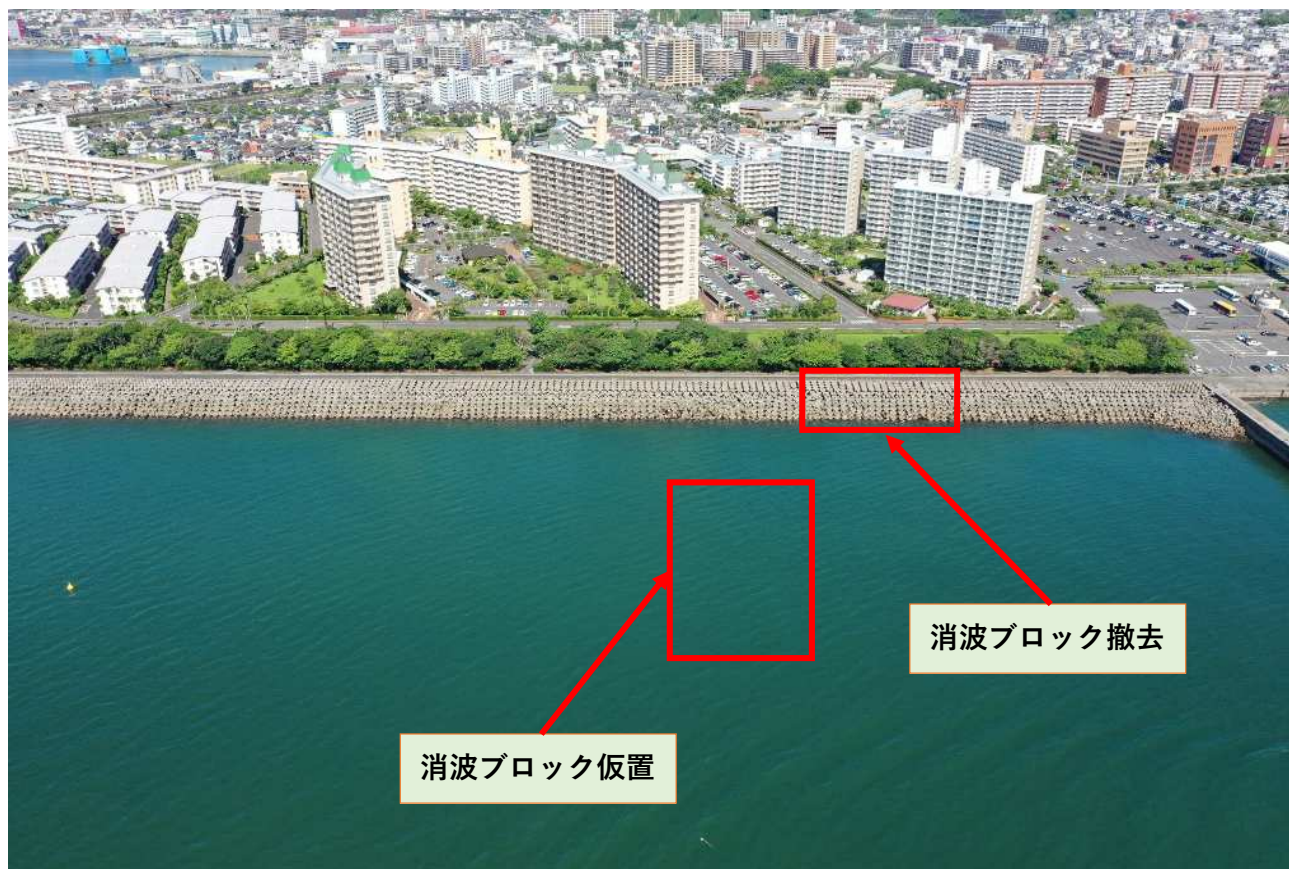

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/26	(月)	構造物撤去工 使用機材等確認	-	9/2	(月)	消波ブロック撤去 仮置	現場停泊
8/27	(火)	構造物撤去工 使用機材等確認	-	9/3	(火)	消波ブロック撤去 仮置	現場停泊
8/28	(水)	クレーン付台船 回航 - 南港	現場停泊	9/4	(水)	消波ブロック撤去 仮置	現場停泊
8/29	(木)	消波ブロック撤去 仮置	現場停泊	9/5	(木)	消波ブロック撤去 仮置	現場停泊
8/30	(金)	消波ブロック撤去 仮置	作業後帰港 南港	9/6	(金)	消波ブロック撤去 仮置	作業後帰港 南港
8/31	(土)	休 工	-	9/7	(土)	休 工	-
9/1	(日)	休 工	-	9/8	(日)	休 工	-
備 考	※隣接工区との調整や天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						
