


工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

## 2週間作業予定表

今週の実績：基礎捨石②荒均し作業を行いました。

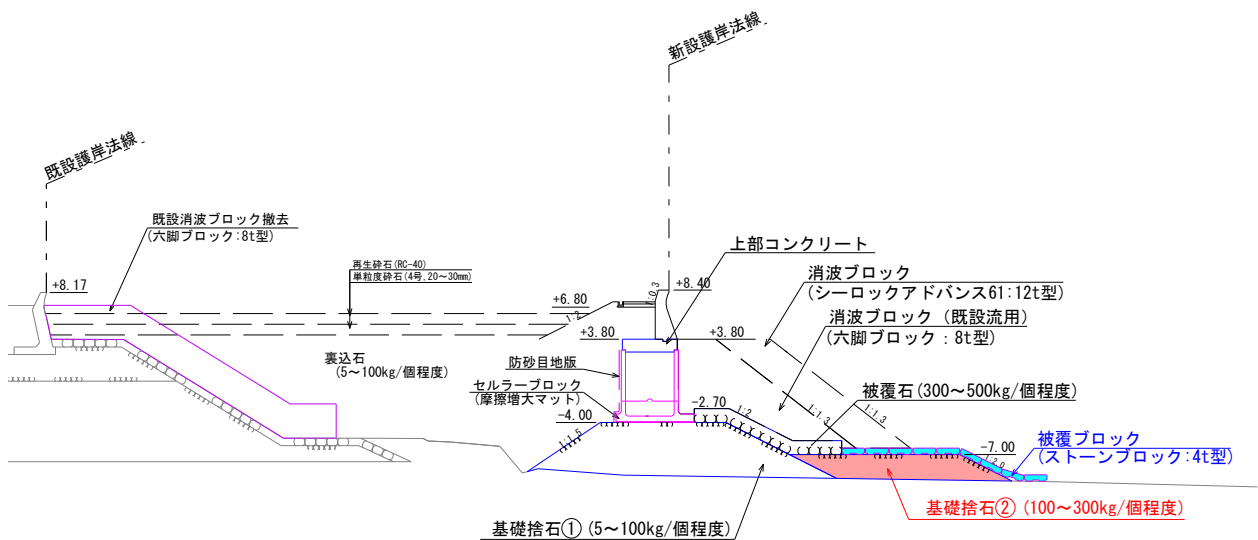

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/9	(月)	被覆ブロック積込・運搬	南港	9/16	(月)	休工	—
9/10	(火)	被覆ブロック据付	南港	9/17	(火)	被覆石均し	—
9/11	(水)	被覆ブロック据付	南港	9/18	(水)	被覆石均し	—
9/12	(木)	被覆ブロック据付	南港	9/19	(木)	休工	—
9/13	(金)	被覆ブロック据付	南港	9/20	(金)	被覆石均し	—
9/14	(土)	被覆石投入	—	9/21	(土)	休工	—
9/15	(日)	休工	—	9/22	(日)	休工	—
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり			備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり		

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-1078)
