


**2週間作業予定表**

消波ブロック撤去状況

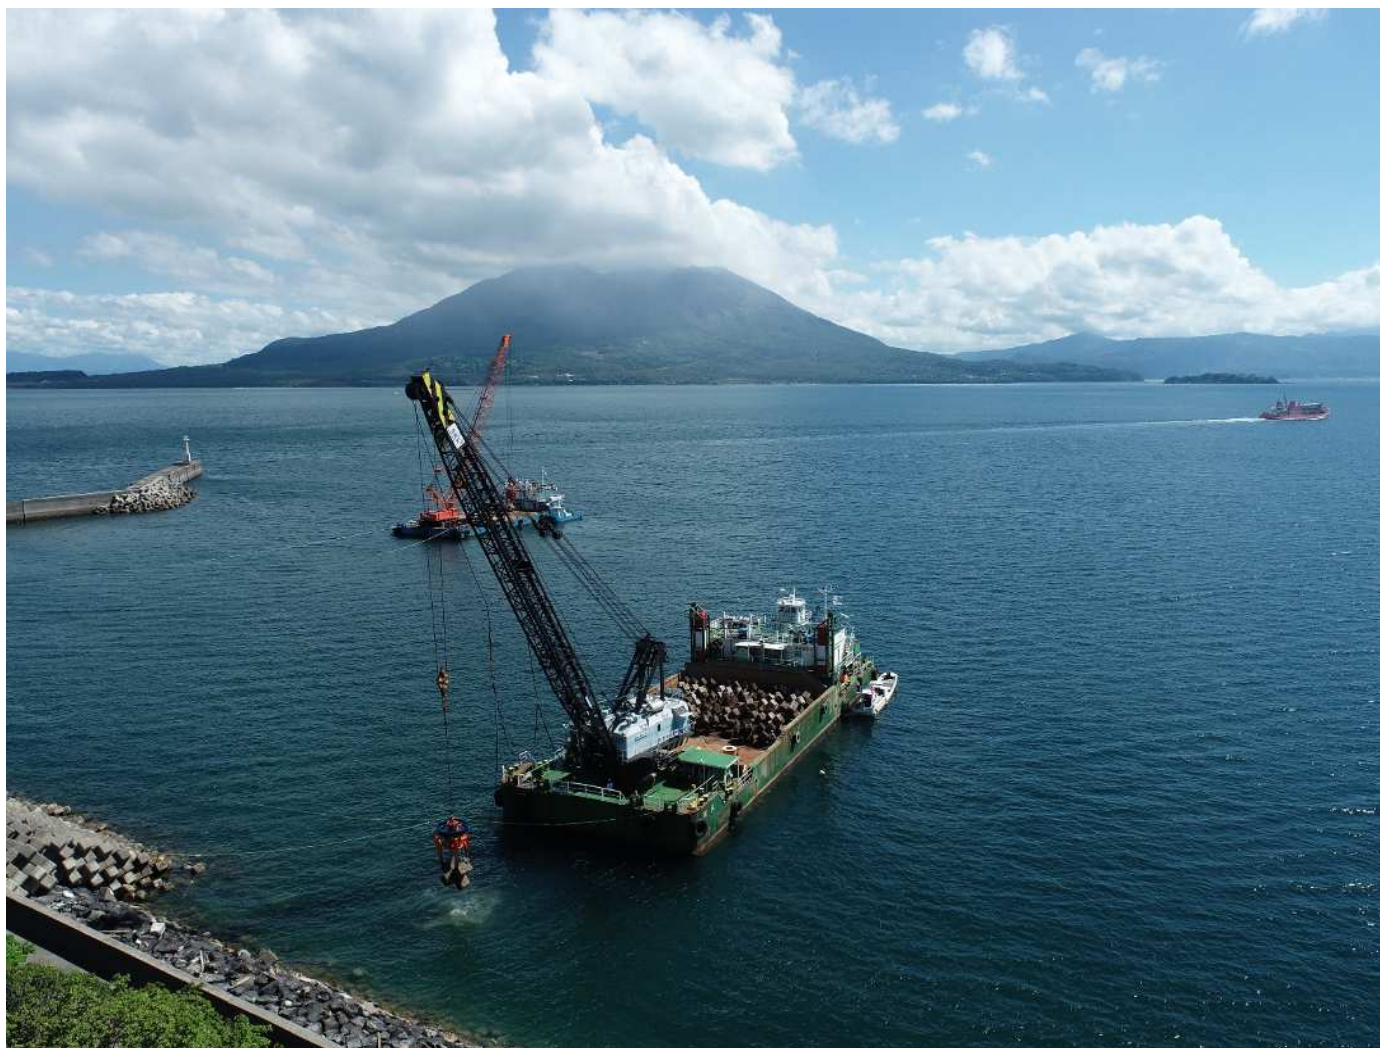

月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
9/23	(月)	休 工	—	9/30	(月)	基礎工 測量	—
9/24	(火)	基礎工 測量	—	10/1	(火)	基礎捨石①投入	—
9/25	(水)	基礎工 測量	—	10/2	(水)	基礎捨石①投入	—
9/26	(木)	基礎工 測量	—	10/3	(木)	基礎捨石①本均し準備	—
9/27	(金)	基礎工 測量	—	10/4	(金)	基礎捨石①本均し準備	—
9/28	(土)	休 工	—	10/5	(土)	休 工	—
9/29	(日)	休 工	—	10/6	(日)	休 工	—
備 考		天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					
