


2週間作業予定表

基礎捨石①投入状況

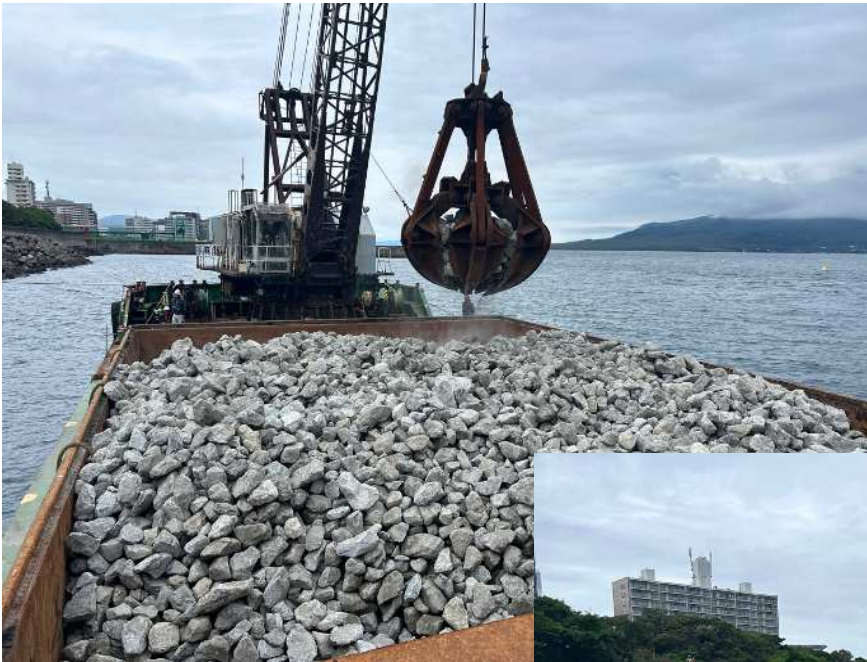

工事名 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)
工種 基礎工 測点
基礎捨石①
捨石投入状況

月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
10/7	(月)	基礎捨石①投入	木材港	10/14	(月)	休 工	—
10/8	(火)	基礎捨石①投入	木材港	10/15	(火)	基礎捨石①本均し	—
10/9	(水)	基礎工 測量	—	10/16	(水)	基礎捨石①本均し	—
10/10	(木)	休 工	—	10/17	(木)	基礎捨石①本均し	—
10/11	(金)	基礎工 測量	—	10/18	(金)	基礎捨石①本均し	—
10/12	(土)	休 工	—	10/19	(土)	休 工	—
10/13	(日)	休 工	—	10/20	(日)	休 工	—

備 考

天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。
