


工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

2週間作業予定表

今週の実績：上部工のコンクリート打設作業を行いました。

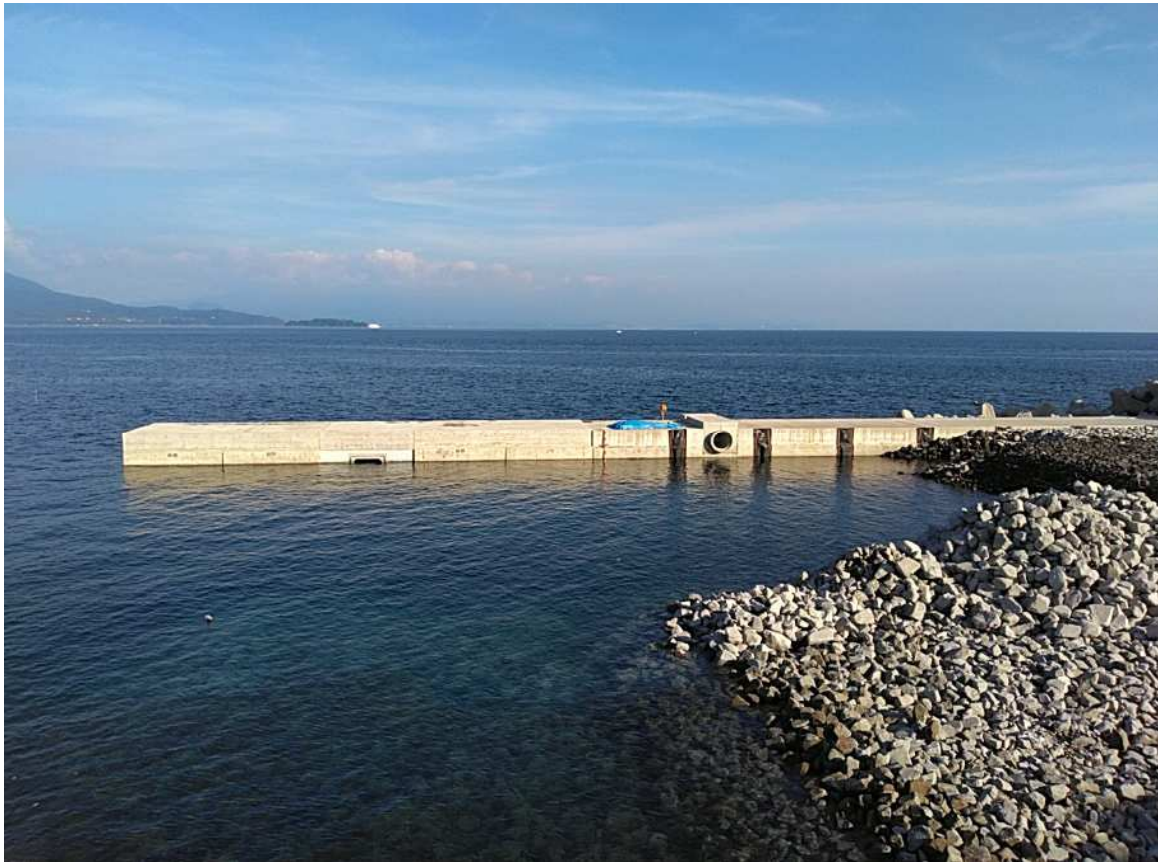

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/4	(月)	休工	—	11/11	(月)	防砂目地板取付	—
11/5	(火)	被覆石均し	—	11/12	(火)	防砂目地板取付	—
11/6	(水)	防砂目地板取付	—	11/13	(水)	防砂目地板取付	—
11/7	(木)	防砂目地板取付	—	11/14	(木)	防砂目地板取付	—
11/8	(金)	防砂目地板取付	—	11/15	(金)	被覆石均し	—
11/9	(土)	休工	—	11/16	(土)	休工	—
11/10	(日)	休工	—	11/17	(日)	休工	—
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり			備考	天候により作業内容及び係留場所は変更あり		

連絡先：(株)渡辺組 (099-296-1078)
