


工事名：令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)

2週間作業予定表

基礎捨石②投入・荒均し状況

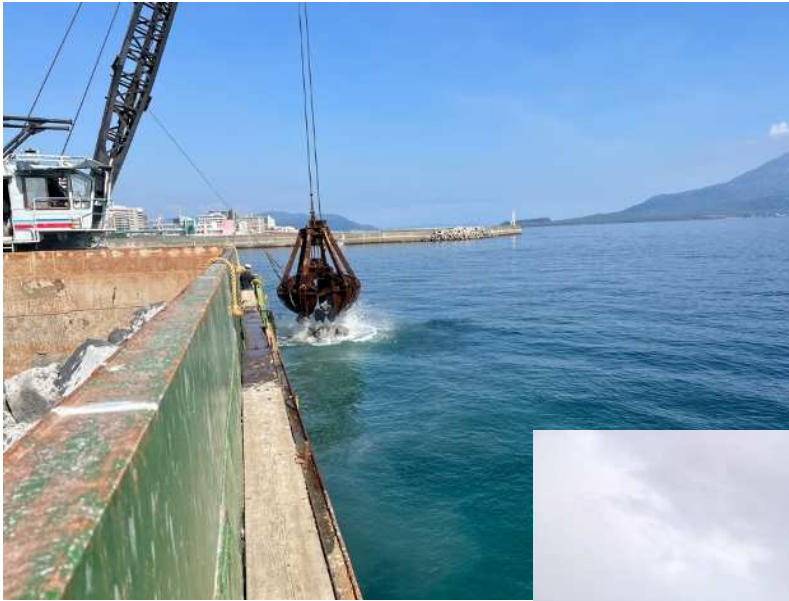

月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
11/18	(月)	捨石②荒均し	—	11/25	(月)	セルラーブロック据付準備	—
11/19	(火)	捨石②荒均し	—	11/26	(火)	セルラーブロック据付準備	—
11/20	(水)	捨石②荒均し	—	11/27	(水)	セルラーブロック据付準備	—
11/21	(木)	捨石②荒均し セルラーブロック据付準備	—	11/28	(木)	セルラーブロック据付準備	南港
11/22	(金)	セルラーブロック据付準備	—	11/29	(金)	セルラーブロック据付	南港
11/23	(土)	休 工	—	11/30	(土)	セルラーブロック据付	南港
11/24	(日)	休 工	—	12/1	(日)	セルラーブロック据付	南港

備 考

天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。
