


工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

【作業予定表】

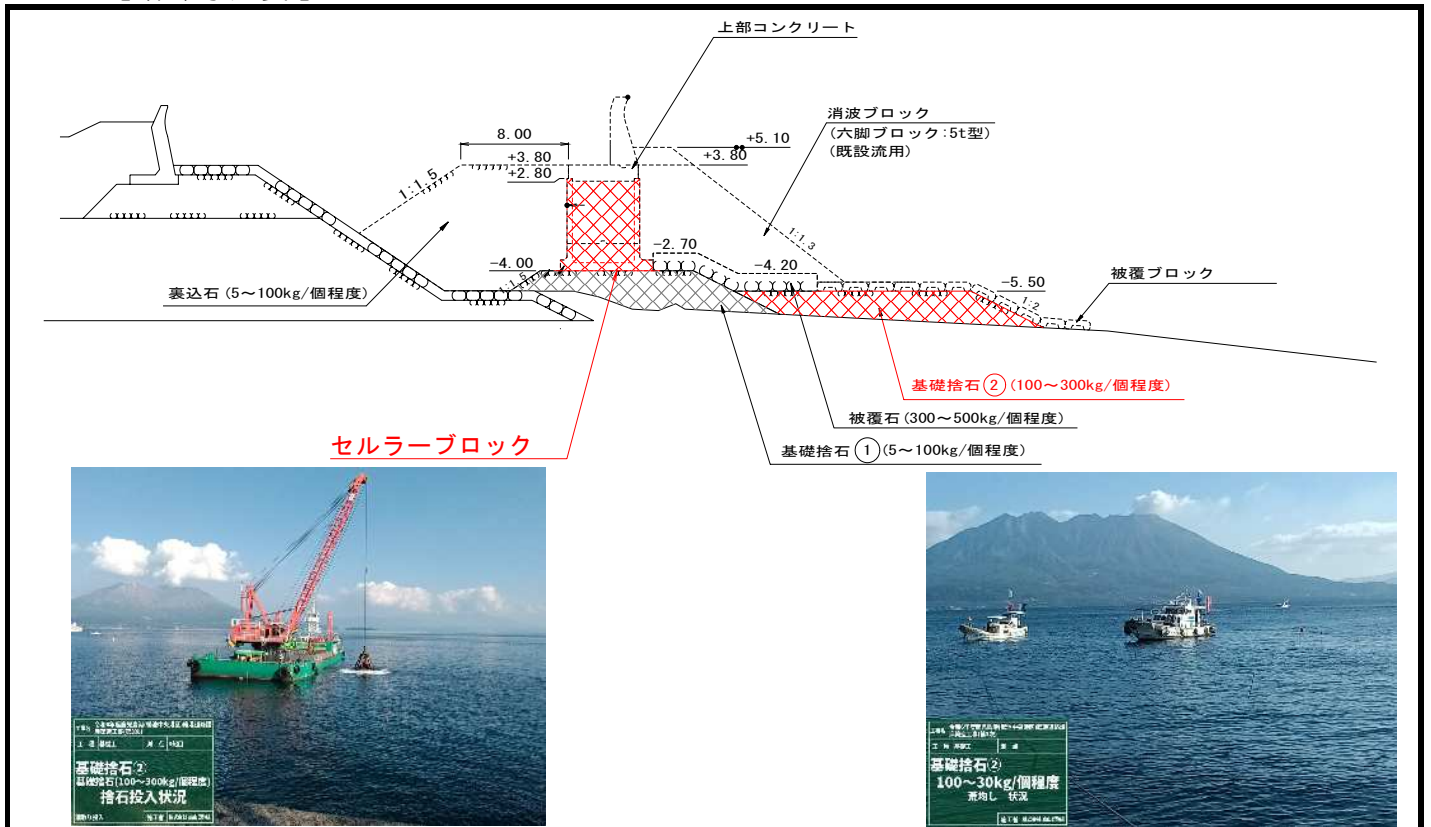

日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
11月18日	月	休工(11/23振替日)	11月25日	月	本體工 中詰石投入
11月19日	火	休工(11/24振替日)	11月26日	火	本體工 中詰石均し
11月20日	水	本體工 据付準備	11月27日	水	上部工 蓋コンクリート打設
11月21日	木	本體工 転置・積込	11月28日	木	基礎工 基礎捨石② 荒均し
11月22日	金	本體工 セルラーブロック据付	11月29日	金	基礎工 基礎捨石② 荒均し
11月23日	土	本體工 セルラーブロック据付	11月30日	土	休工
11月24日	日	本體工 中詰石投入	12月1日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				
