


工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)

2週間作業予定表

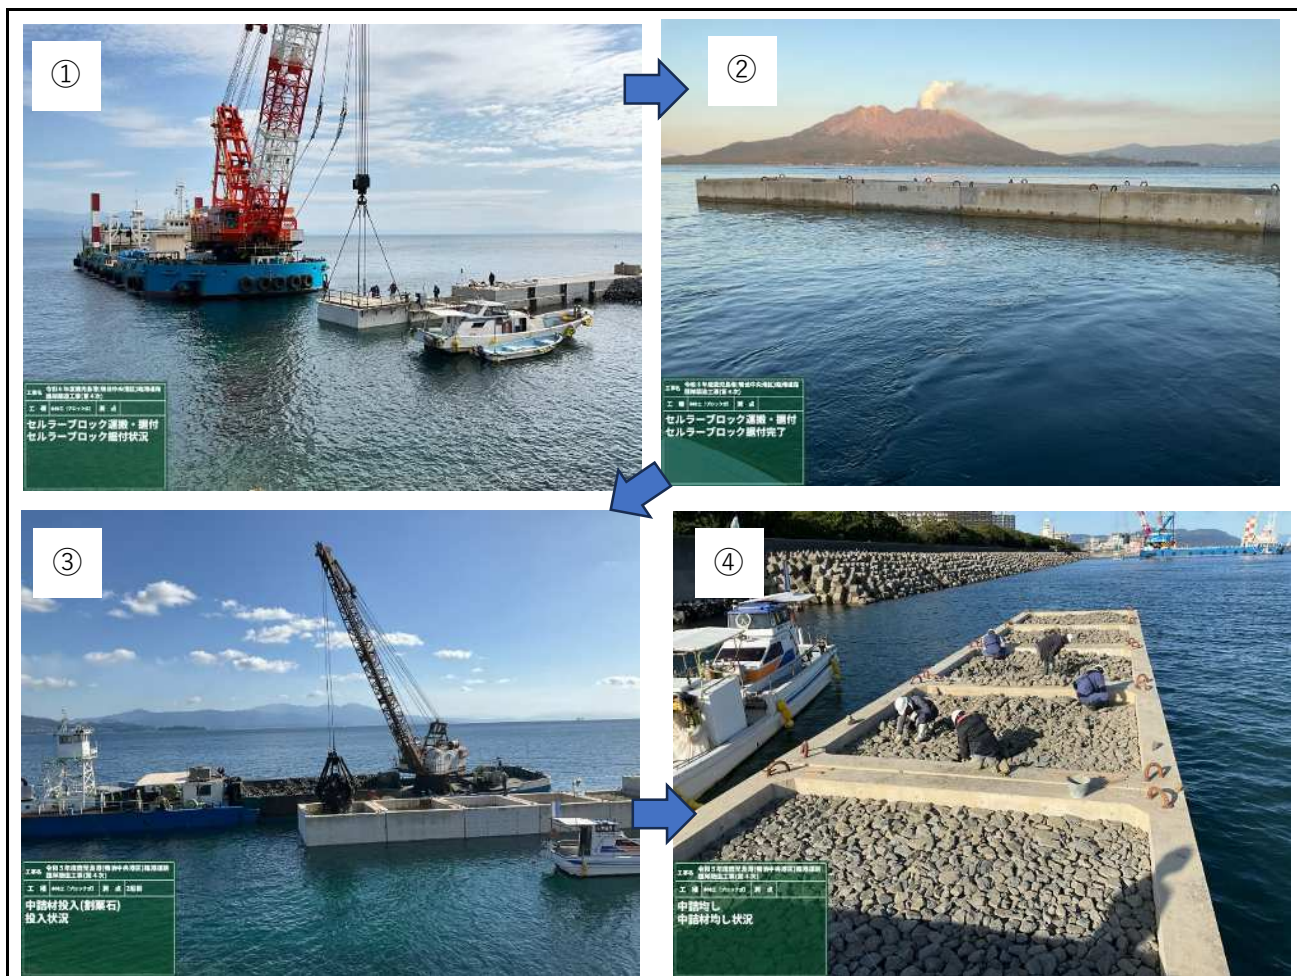

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/16	(月)	本体工 中詰雑石均し	-	12/23	(月)	被覆根固工 被覆石均し	-
12/17	(火)	上部工 コンクリート打設	作業台船 南港	12/24	(火)	被覆根固工 被覆石均し	-
12/18	(水)	本体工 出来形測量	-	12/25	(水)	被覆根固工 被覆石均し	-
12/19	(木)	本体工 出来形検査	-	12/26	(木)	被覆根固工 被覆石均し	-
12/20	(金)	被覆根固工 被覆石投入	-	12/27	(金)	被覆根固工 被覆石均し	-
12/21	(土)	休工	-	12/28	(土)	年末年始休暇	-
12/22	(日)	休工	-	12/29	(日)	12/28-1/5	-
備考	12/28-1/5 年末年始休暇 天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						
