



## 2週間作業予定表

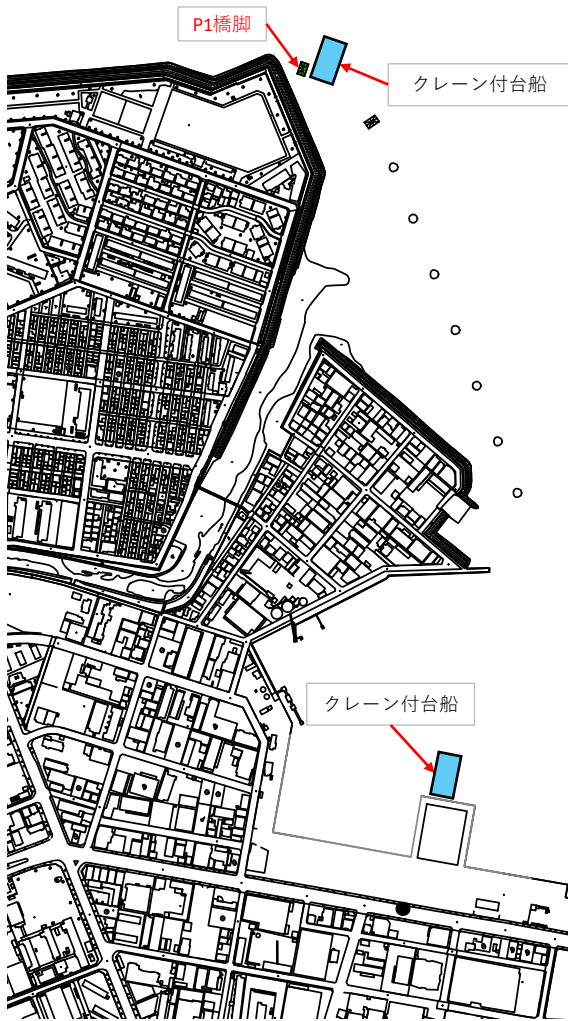

### 1 仮設工 導杭・導枠設置

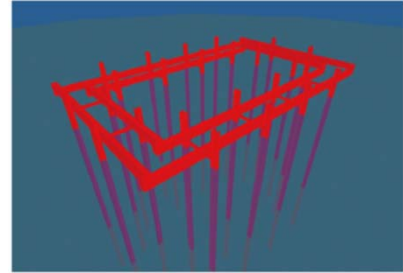

橋脚位置に「導杭・導枠」を設置します。導枠は、のちに設置する鋼管矢板を海底地盤に鉛直に打ち込むための定規の役割を果たします。



導杭設置状況  
(過去工事)

2週間作業予定表

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
1/13	(月)	休工	南港	1/20	(月)	導杭・導枠設置	P1係留
1/14	(火)	鋼管矢板搬入	南港	1/21	(火)	導杭・導枠設置	P1係留
1/15	(水)	資材積込	南港	1/22	(水)	導杭・導枠設置	P1係留
1/16	(木)	導杭・導枠設置	P1係留	1/23	(木)	導杭・導枠設置	南港
1/17	(金)	導杭・導枠設置	P1係留	1/24	(金)	鋼管矢板搬入	南港
1/18	(土)	休工	P1係留	1/25	(土)	休工	南港
1/19	(日)	休工	P1係留	1/26	(日)	休工	南港
備考	天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。						
