


工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

【 作業予定表 】

裏込材投入状況



裏込材投入図 (雑石5~100kg/個程度)
被覆ブロック据付図 (2t型)

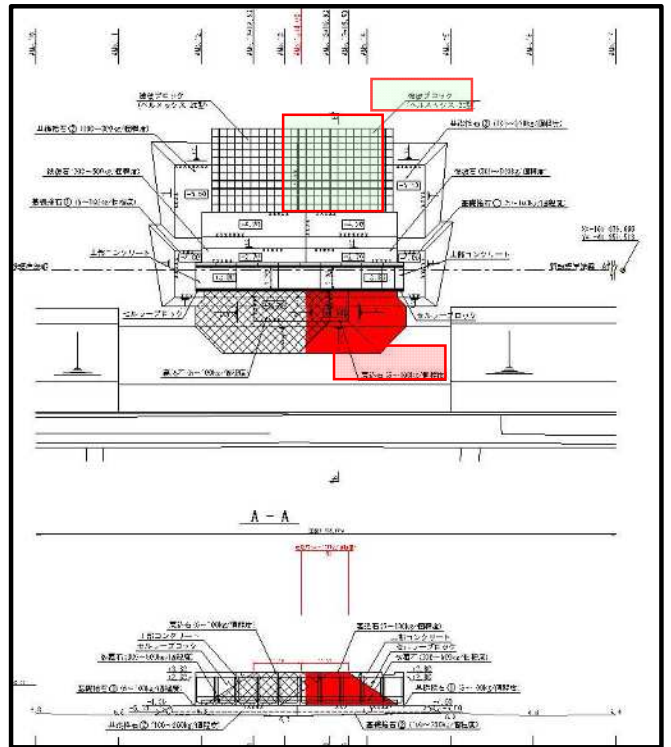

日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
1月27日	月	被覆・根固工 被覆ブロック積込・運搬	2月3日	月	被覆・根固工：被覆石投入 裏込工：裏込材投入
1月28日	火	被覆・根固工 被覆ブロック据付	2月4日	火	裏込工：裏込材投入
1月29日	水	被覆・根固工 被覆ブロック据付	2月5日	水	被覆・根固工 被覆石均し
1月30日	木	被覆・根固工 被覆ブロック据付	2月6日	木	被覆・根固工 被覆石均し
1月31日	金	被覆・根固工 被覆ブロック施工管理	2月7日	金	被覆・根固工 被覆石均し
2月1日	土	休工	2月8日	土	休工
2月2日	日	休工	2月9日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				



株式会社 森山(清)組
TEL 099-252-1313

