


工事名：令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

2週間作業予定表

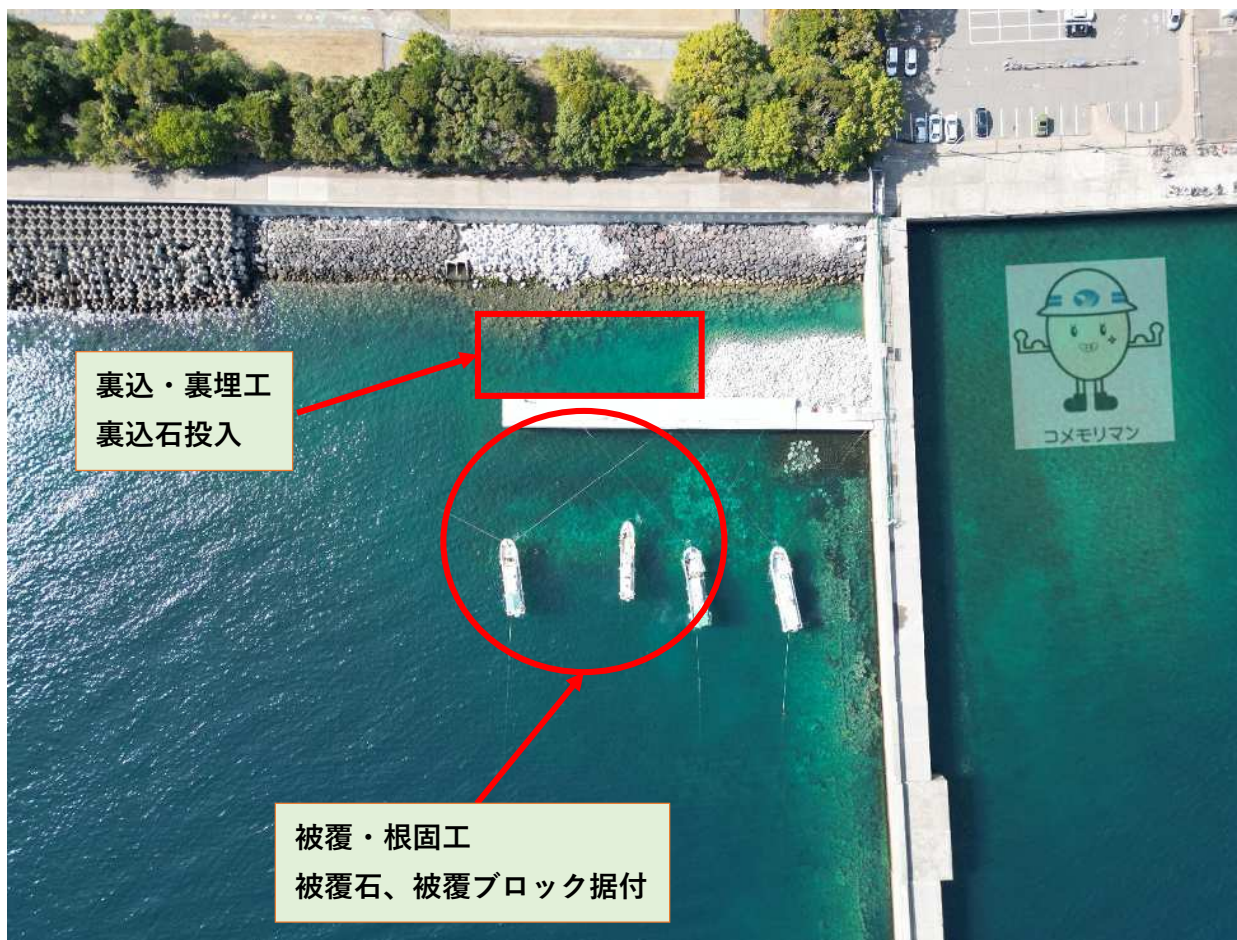

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/24	(月)	基礎工 基礎捨石②荒均し	—	3/3	(月)	基礎工 水中部検査	—
2/25	(火)	基礎工 基礎捨石②荒均し	—	3/4	(火)	被覆・根固工 被覆石投入	—
2/26	(水)	基礎工 基礎捨石②荒均し	—	3/5	(水)	被覆・根固工 被覆ブロック積込	—
2/27	(木)	裏込・裏埋工 裏込石投入	—	3/6	(木)	被覆・根固工 被覆ブロック据付	—
2/28	(金)	基礎工 基礎捨石②荒均し	—	3/7	(金)	被覆・根固工 被覆ブロック据付	—
3/1	(土)	裏込・裏埋工 裏込石投入	—	3/8	(土)	休 工	—
3/2	(日)	休 工	—	3/9	(日)	休 工	—
備 考	※隣接工区との調整や天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						
