



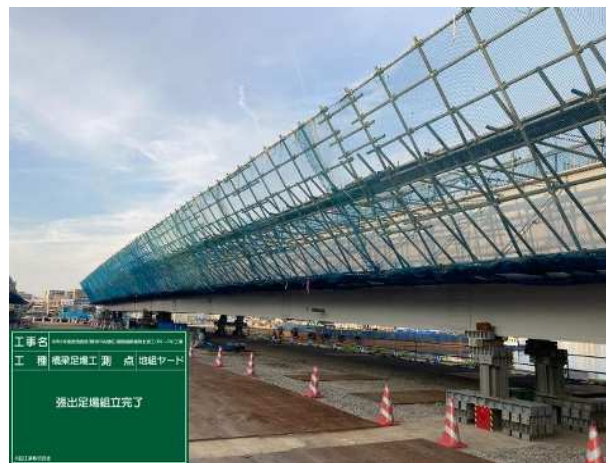

張出足場組立完了(5/15撮影)

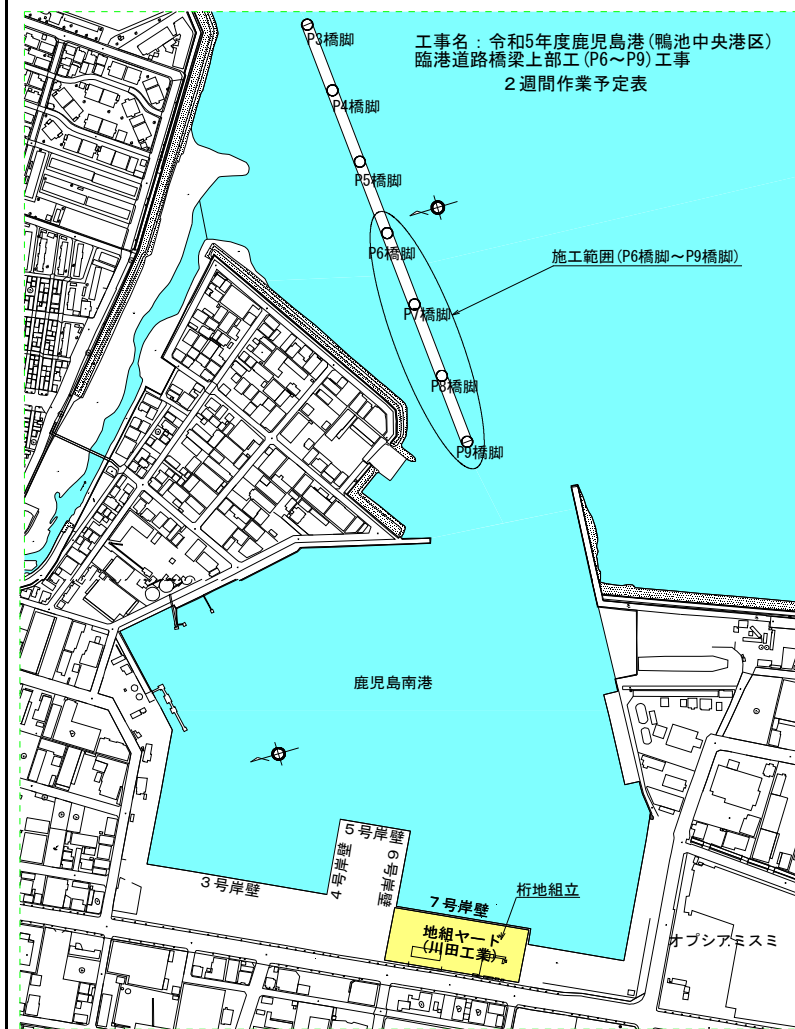

常設足場設置完了(5/15撮影)

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/19	(月)	中段足場組立 現場塗装(陸上)	—	5/26	(月)	張出足場組立 現場塗装(陸上)	—
5/20	(火)	中段足場組立 現場塗装(陸上)	—	5/27	(火)	張出足場組立 現場塗装(陸上)	—
5/21	(水)	中段足場組立 現場塗装(陸上)	—	5/28	(水)	張出足場組立 現場塗装(陸上)	—
5/22	(木)	張出足場組立 現場塗装(陸上)	—	5/29	(木)	セッティングビーム 連結金具取付	—
5/23	(金)	張出足場組立 現場塗装(陸上)	—	5/30	(金)	大ブロック 吊金具取付	—
5/24	(土)	休 工	—	5/31	(土)	休 工	—
5/25	(日)	休 工	—	6/1	(日)	休 工	—
備 考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					
