


2週間作業予定表

工事名: 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)

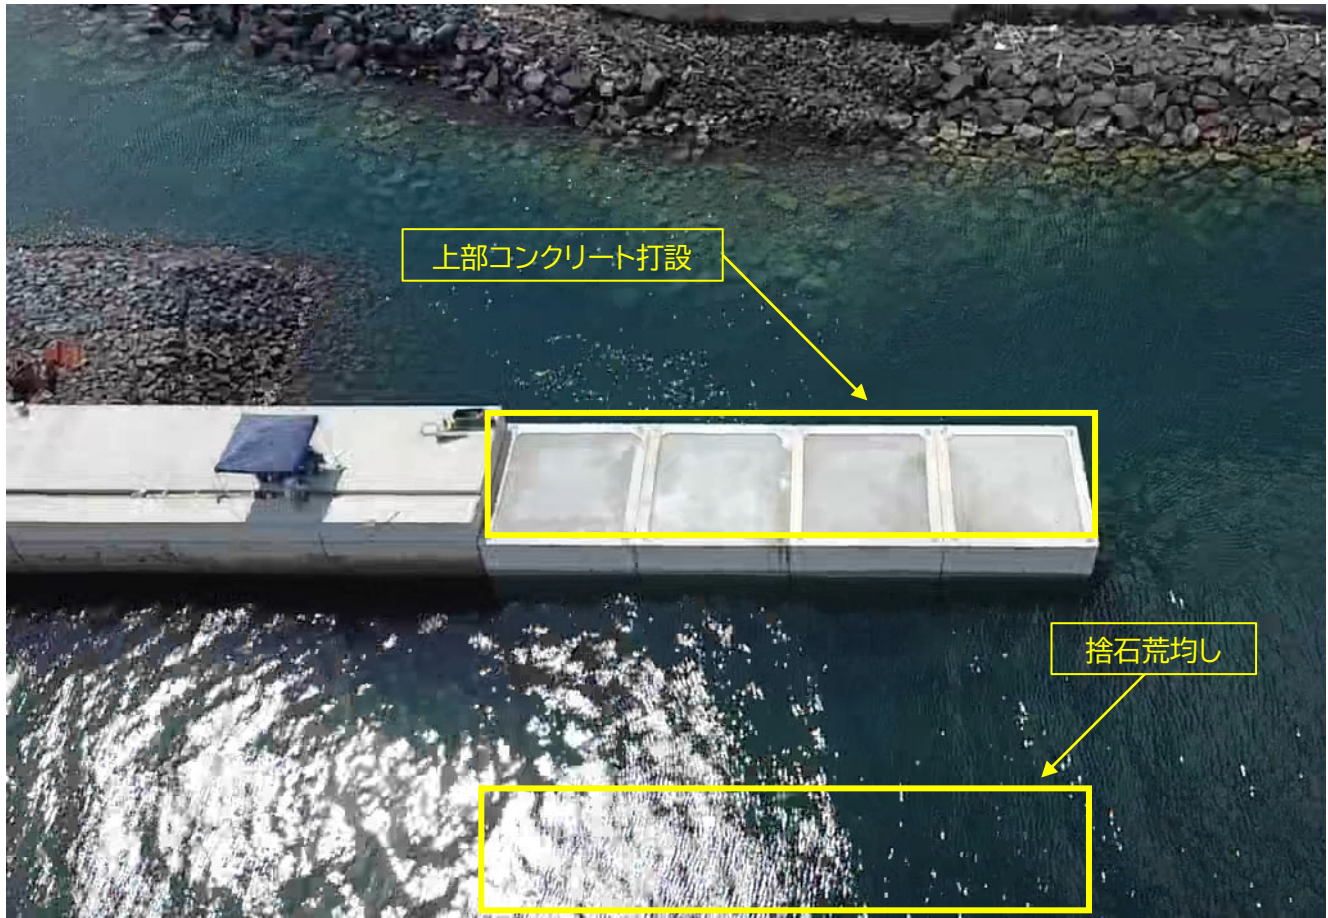

月 日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月 日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/25	月	型枠組立	現場	9/1	月	コンクリート打設	現場
8/26	火	型枠組立	現場	9/2	火	休工	現場
8/27	水	コンクリート打設	現場	9/3	水	型枠取外・美装	南港
8/28	木	コンクリート養生	現場	9/4	木	捨石荒均し	-
8/29	金	型枠組外・型枠組立	現場	9/5	金	捨石荒均し	-
8/30	土	型枠組立	南港	9/6	土	休工	-
8/31	日	休工	南港	9/7	日	休工	-
備 考		天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					
