


## 2週間作業予定表

工事名: 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)

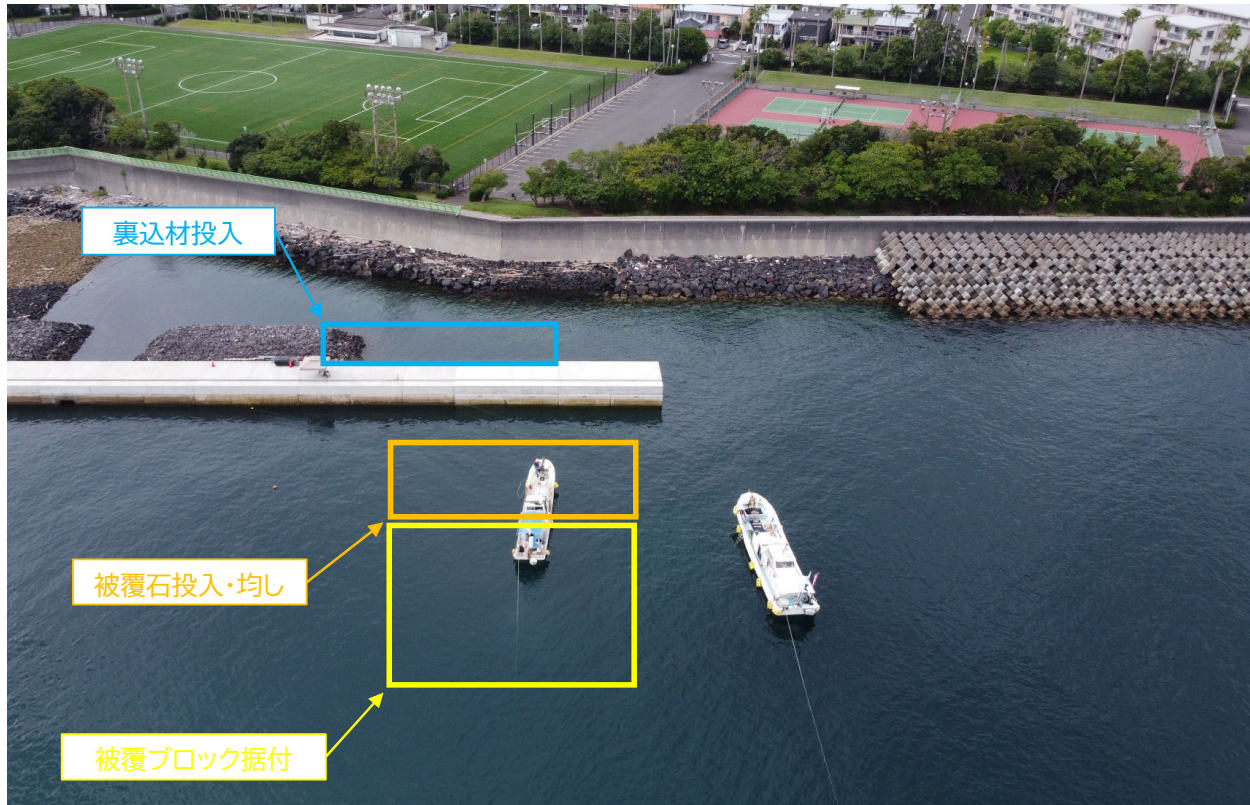

| 月 日   | 曜日 | 作業予定                                    | 作業船の係留場所 | 月 日   | 曜日 | 作業予定                               | 作業船の係留場所 |
|-------|----|-----------------------------------------|----------|-------|----|------------------------------------|----------|
| 10/6  | 月  | 基礎工<br>荒均し出来形検査<br>裏込・裏埋工<br>防砂目地板出来形検査 | -        | 10/13 | 月  | 休 工                                | 南港       |
| 10/7  | 火  | 被覆・根固工<br>被覆ブロック据付準備                    | -        | 10/14 | 火  | 被覆・根固工<br>被覆ブロック据付                 | -        |
| 10/8  | 水  | 被覆・根固工<br>被覆ブロック据付準備                    | -        | 10/15 | 水  | 被覆・根固工<br>被覆ブロック出来形検査              | -        |
| 10/9  | 木  | 被覆・根固工<br>被覆ブロック積込・運搬                   | 南港       | 10/16 | 木  | 被覆・根固工<br>被覆石投入<br>裏込・裏埋工<br>裏込石投入 | -        |
| 10/10 | 金  | 被覆・根固工<br>被覆ブロック据付                      | 南港       | 10/17 | 金  | 被覆・根固工<br>被覆石均し                    | -        |
| 10/11 | 土  | 休 工                                     | 南港       | 10/18 | 土  | 休 工                                | -        |
| 10/12 | 日  | 休 工                                     | 南港       | 10/19 | 日  | 休 工                                | -        |
| 備 考   |    | 天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。           |          |       |    |                                    |          |
