


2週間作業予定表

工事名: 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)

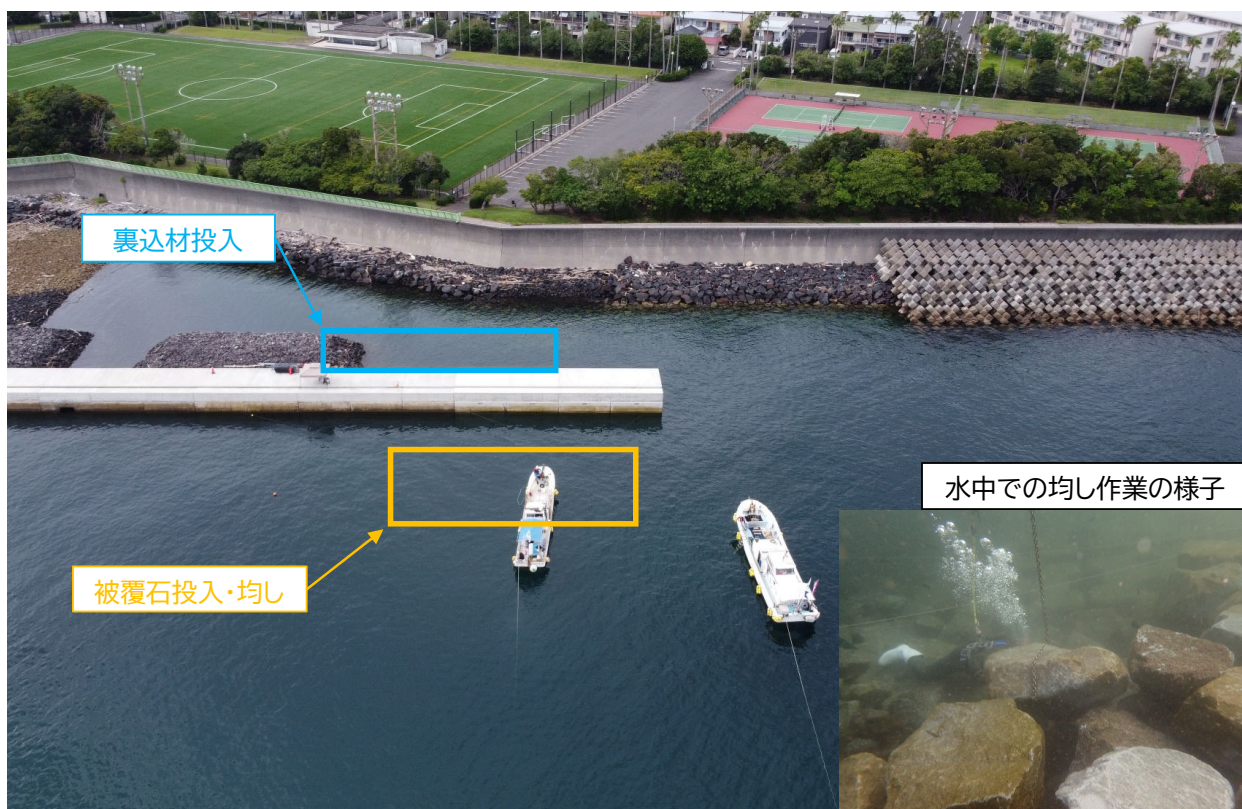

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/20	月	被覆・根固工 被覆石均し	-	10/27	月	裏込・裏埋工 裏込石投入	-
10/21	火	被覆・根固工 被覆石均し	-	10/28	火	裏込・裏埋工 裏込石整形	-
10/22	水	被覆・根固工 被覆石均し	-	10/29	水	裏込・裏埋工 裏込石整形	-
10/23	木	被覆・根固工 被覆石均し	-	10/30	木	被覆・根固工 被覆石均し	-
10/24	金	休工	-	10/31	金	被覆・根固工 被覆石投入 裏込・裏埋工 裏込石投入	-
10/25	土	休工	-	11/1	土	裏込・裏埋工 裏込石投入	-
10/26	日	休工	-	11/2	日	休工	-
備考	天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						
