
2週間作業予定表

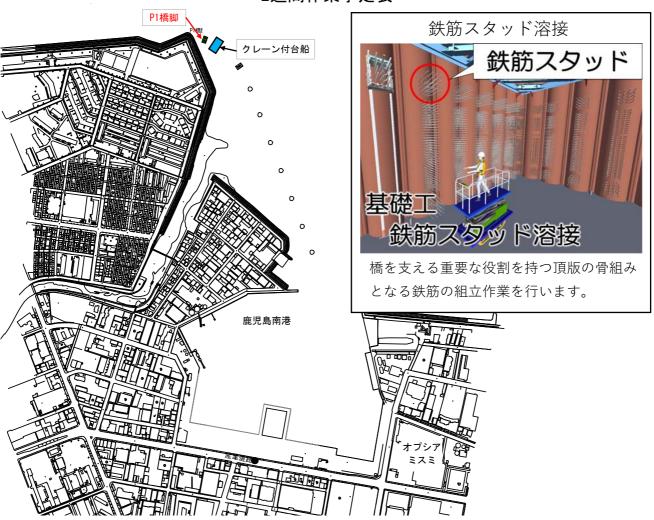

月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
11/17	(月)	底盤コンクリート 打設準備	木材港	11/24	(月)	休 工	南港
11/18	(火)	底盤コンクリート 打設準備	P1橋脚	11/25	(火)	頂版鉄筋組立準備	P1橋脚
11/19	(水)	底盤コンクリート打設	P1橋脚	11/26	(水)	頂版鉄筋組立準備	P1橋脚
11/20	(木)	濁水処理設備解体	P1橋脚	11/27	(木)	頂版スタッド鉄筋溶接	P1橋脚
11/21	(金)	昇降足場設置	P1橋脚	11/28	(金)	頂版スタッド鉄筋溶接	P1橋脚
11/22	(土)	休 エ	南港	11/29	(土)	休工	南港
11/23	(日)	休 エ	南港	11/30	(日)	休工	南港
備考 天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。							

連絡先:みらい建設工業㈱ (099-814-9170)
