
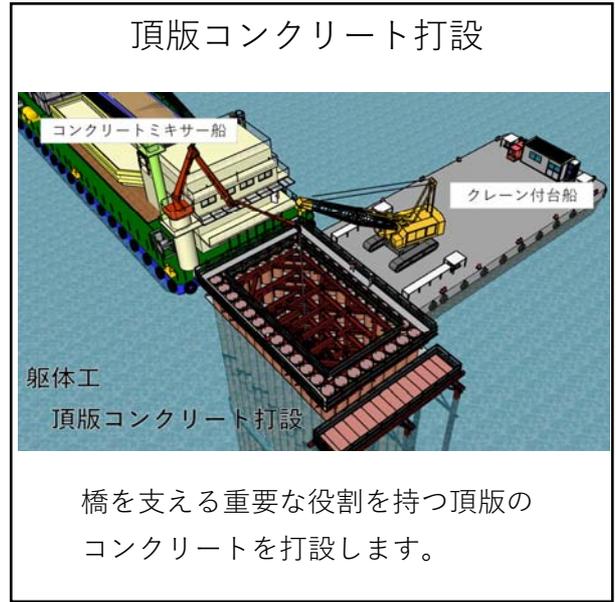


2週間作業予定表

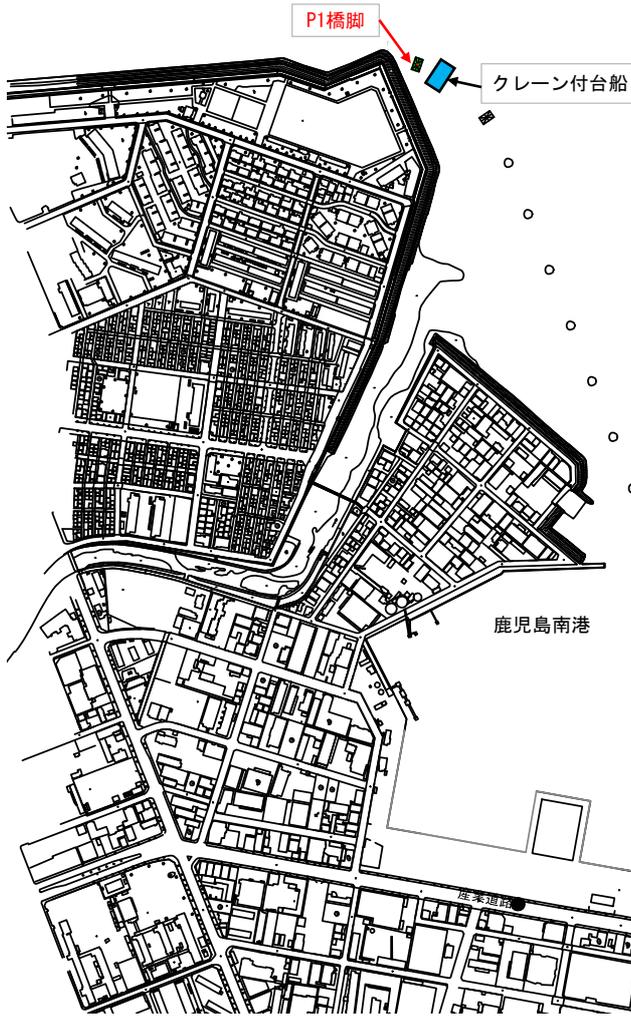

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/23	(月)	休工	南港	3/2	(月)	頂版コンクリート打設準備	P1橋脚
2/24	(火)	支保工撤去	P1橋脚	3/3	(火)	頂版コンクリート打設	P1橋脚
2/25	(水)	支保工撤去	P1橋脚	3/4	(水)	頂版コンクリート養生	P1橋脚
2/26	(木)	頂版鉄筋組立	P1橋脚	3/5	(木)	支保工撤去	P1橋脚
2/27	(金)	頂版コンクリート打設準備	P1橋脚	3/6	(金)	支保工撤去	P1橋脚
2/28	(土)	休工	南港	3/7	(土)	休工	南港
3/1	(日)	休工	南港	3/8	(日)	休工	南港
備考	天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。 3月3日(火)作業予定の頂版コンクリート打設時は、17時以降の残業が発生する可能性があります。 ご不便、ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。						
