
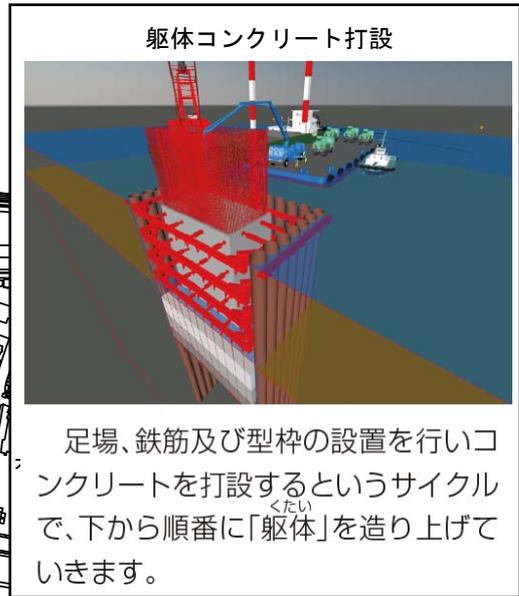


## 2週間作業予定表

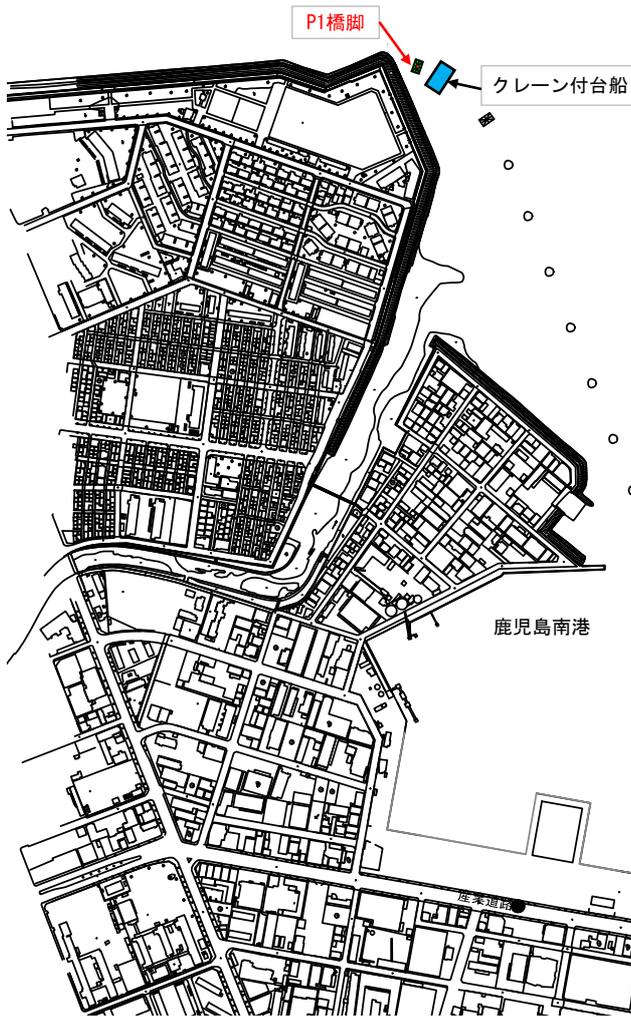

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/23	(月)	足場設置	P1橋脚	3/30	(月)	鉄筋組立	P1橋脚
3/24	(火)	足場設置・鉄筋組立	P1橋脚	3/31	(火)	打設準備	P1橋脚
3/25	(水)	鉄筋組立	P1橋脚	4/1	(水)	型枠組立	P1橋脚
3/26	(木)	鉄筋組立	P1橋脚	4/2	(木)	型枠組立	P1橋脚
3/27	(金)	鉄筋組立	P1橋脚	4/3	(金)	躯体コンクリート(1Lot)打設	P1橋脚
3/28	(土)	休工	南港	4/4	(土)	休工	南港
3/29	(日)	休工	南港	4/5	(日)	休工	南港
備考		天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。					
