


工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事  
川田工業株式会社 2週間作業予定表



地覆鉄筋組立完了



地覆型枠組立状況

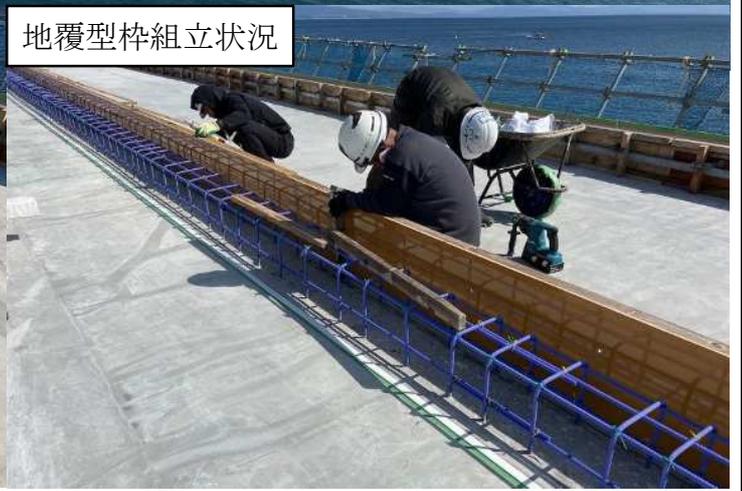

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/9	(月)	地覆型枠組立(海上) 高欄アンカー設置(海上)	南港7号岸壁	3/16	(月)	地覆型枠組立(海上) 導水管設置(海上)	南港7号岸壁
3/10	(火)	地覆型枠組立(海上) 高欄アンカー設置(海上)	南港7号岸壁	3/17	(火)	地覆型枠組立(海上) 導水管設置(海上)	南港7号岸壁
3/11	(水)	地覆型枠組立(海上) 高欄アンカー設置(海上)	南港7号岸壁	3/18	(水)	地覆型枠組立(海上) 導水管設置(海上)	南港7号岸壁
3/12	(木)	地覆型枠組立(海上) 高欄アンカー設置(海上)	南港7号岸壁	3/19	(木)	地覆型枠組立(海上) 導水管設置(海上)	南港7号岸壁
3/13	(金)	地覆型枠組立(海上) 高欄アンカー設置(海上)	南港7号岸壁	3/20	(金)	休 工	—
3/14	(土)	休 工	—	3/21	(土)	休 工	—
3/15	(日)	休 工	—	3/22	(日)	休 工	—
備 考	天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						
