
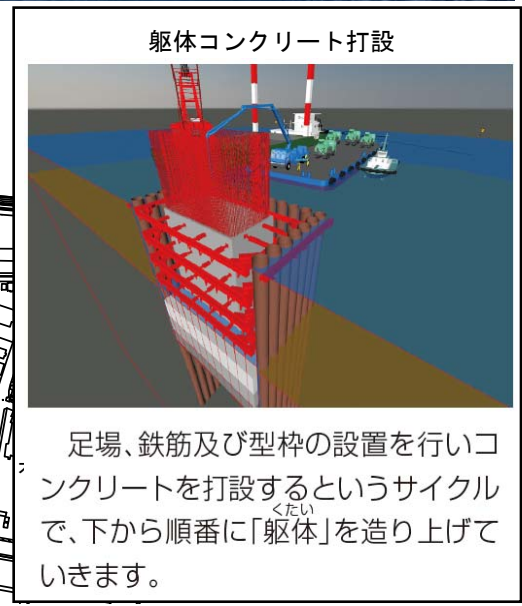
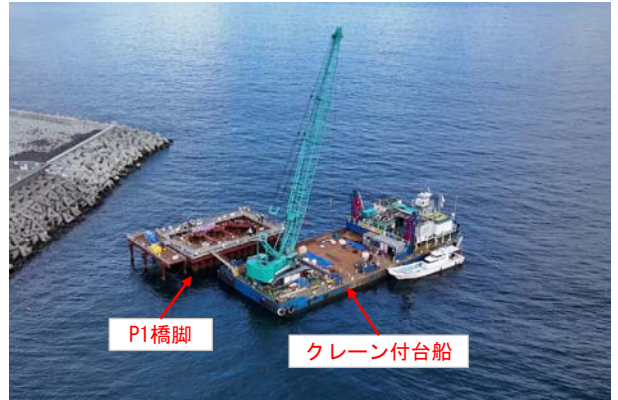


## 2週間作業予定表

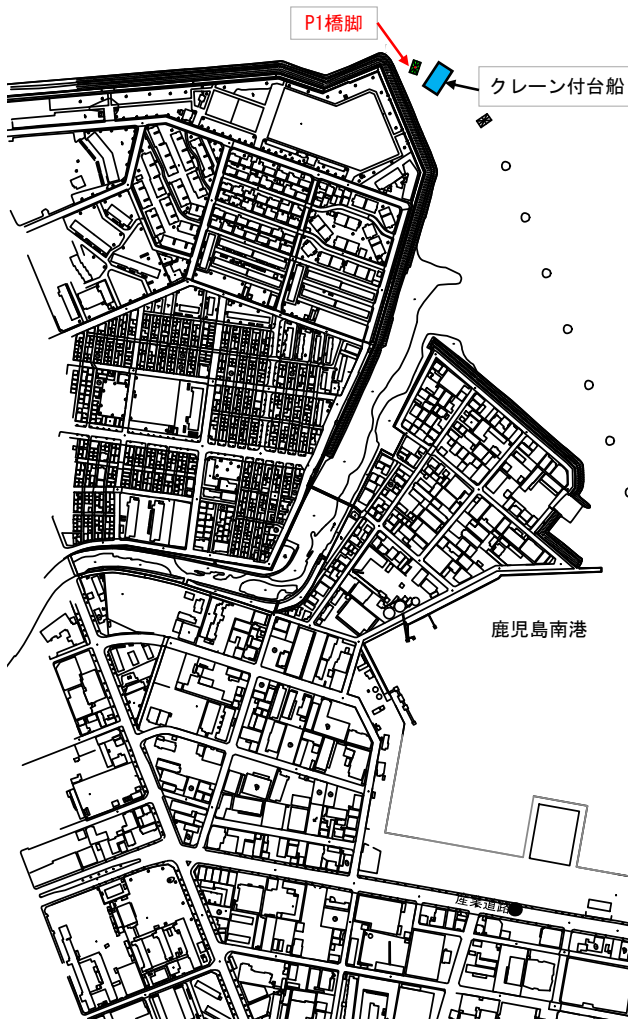

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
4/20	(月)	躯体コンクリート打設	P1橋脚	4/27	(月)	支保工設置	P1橋脚
4/21	(火)	コンクリート養生	P1橋脚	4/28	(火)	支保工設置	P1橋脚
4/22	(水)	支保工設置準備	P1橋脚	4/29	(水)	支保工設置	P1橋脚
4/23	(木)	支保工設置準備	P1橋脚	4/30	(木)	支保工撤去	P1橋脚
4/24	(金)	躯体コンクリート型枠取外し	P1橋脚	5/1	(金)	休工	木材港
4/25	(土)	休工	南港	5/2	(土)	休工	木材港
4/26	(日)	休工	南港	5/3	(日)	休工	木材港
備考	天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。						
