


2週間作業予定表

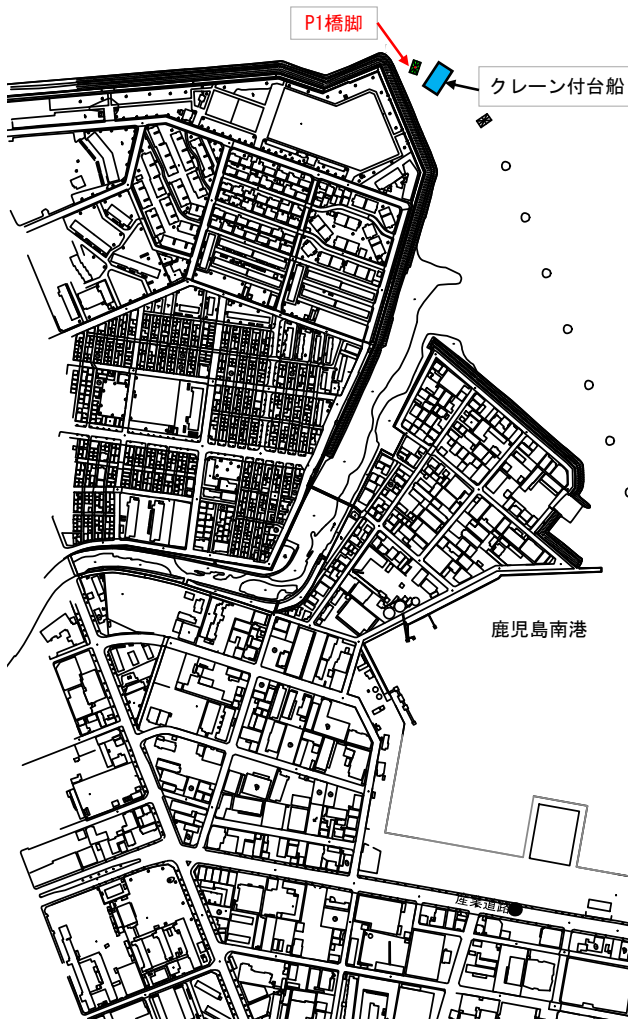

躯体コンクリート打設

足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に「躯体」を造り上げていきます。

A 3D computer-generated rendering showing the construction process. It depicts a red structure being built from the bottom up, with a crane barge and other equipment visible in the background.

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/15	(月)	躯体コンクリート型枠取外し(4ロット)	P1橋脚	6/22	(月)	足場設置	P1橋脚
6/16	(火)	支保工盛替え(2段目)	P1橋脚	6/23	(火)	足場設置 躯体鉄筋組立(5ロット)	P1橋脚
6/17	(水)	支保工盛替え(2段目)	P1橋脚	6/24	(水)	躯体鉄筋組立(5ロット)	P1橋脚
6/18	(木)	支保工撤去(1段目)	P1橋脚	6/25	(木)	躯体鉄筋組立(5ロット)	P1橋脚
6/19	(金)	支保工撤去(1段目)	P1橋脚	6/26	(金)	躯体鉄筋組立(5ロット)	P1橋脚
6/20	(日)	休工	南港	6/27	(土)	休工	南港
6/21	(日)	休工	南港	6/28	(日)	休工	南港
備考	天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。						
