


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P 1 1）工事

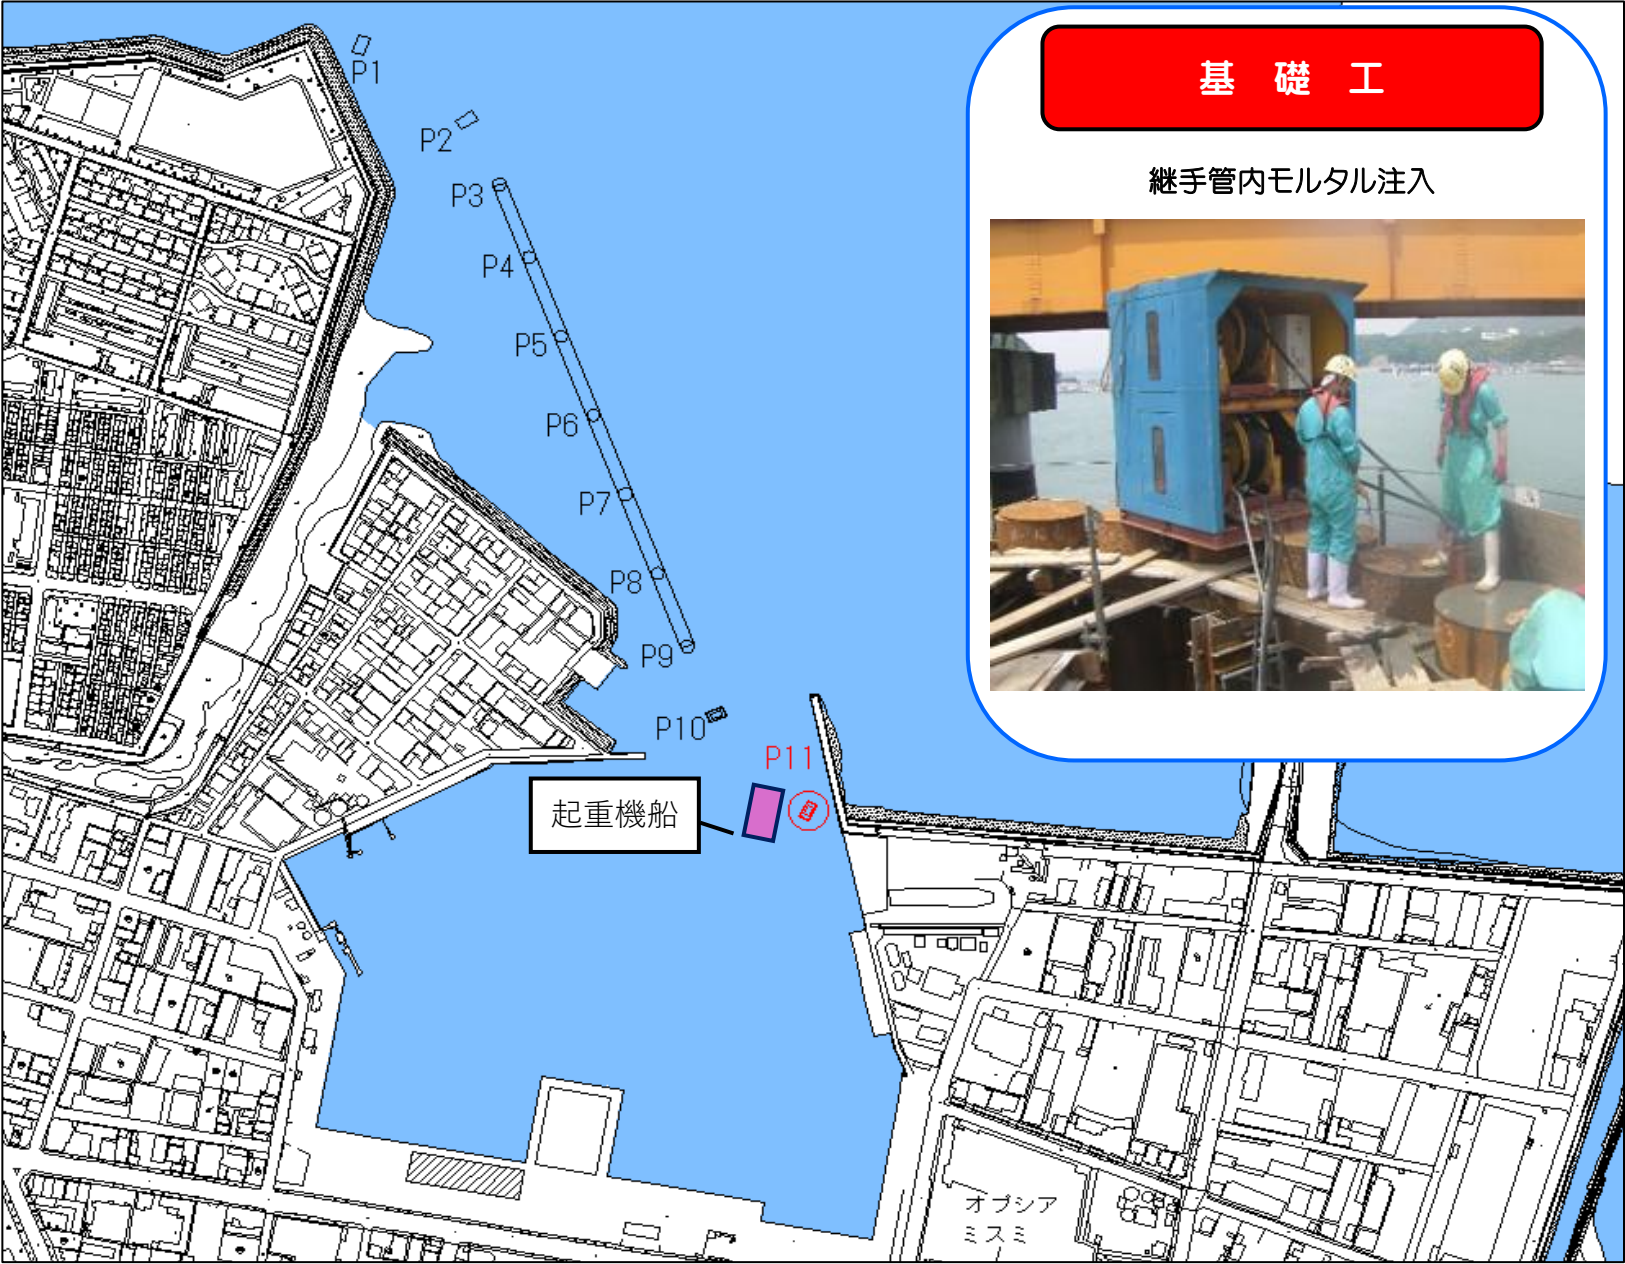

2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/27	(月)	継手管内排土	南港	8/3	(月)	継手管内モルタル注入	南港
7/28	(火)	継手管内モルタル注入	南港	8/4	(火)	継手管内止水材注入	南港
7/29	(水)	継手管内モルタル注入	南港	8/5	(水)	継手管内止水材注入	南港
7/30	(水)	継手管内モルタル注入	南港	8/6	(木)	継手管内止水材注入	南港
7/31	(金)	継手管内モルタル注入	南港	8/7	(金)	継手管内止水材注入	南港
8/1	(土)	休 工	—	8/8	(土)	休 工	—
8/2	(日)	休 工	—	8/9	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：若築・吉田特定建設工事共同企業体（099-299-8075）
