


工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)
南生建設株式会社 2週間作業予定表

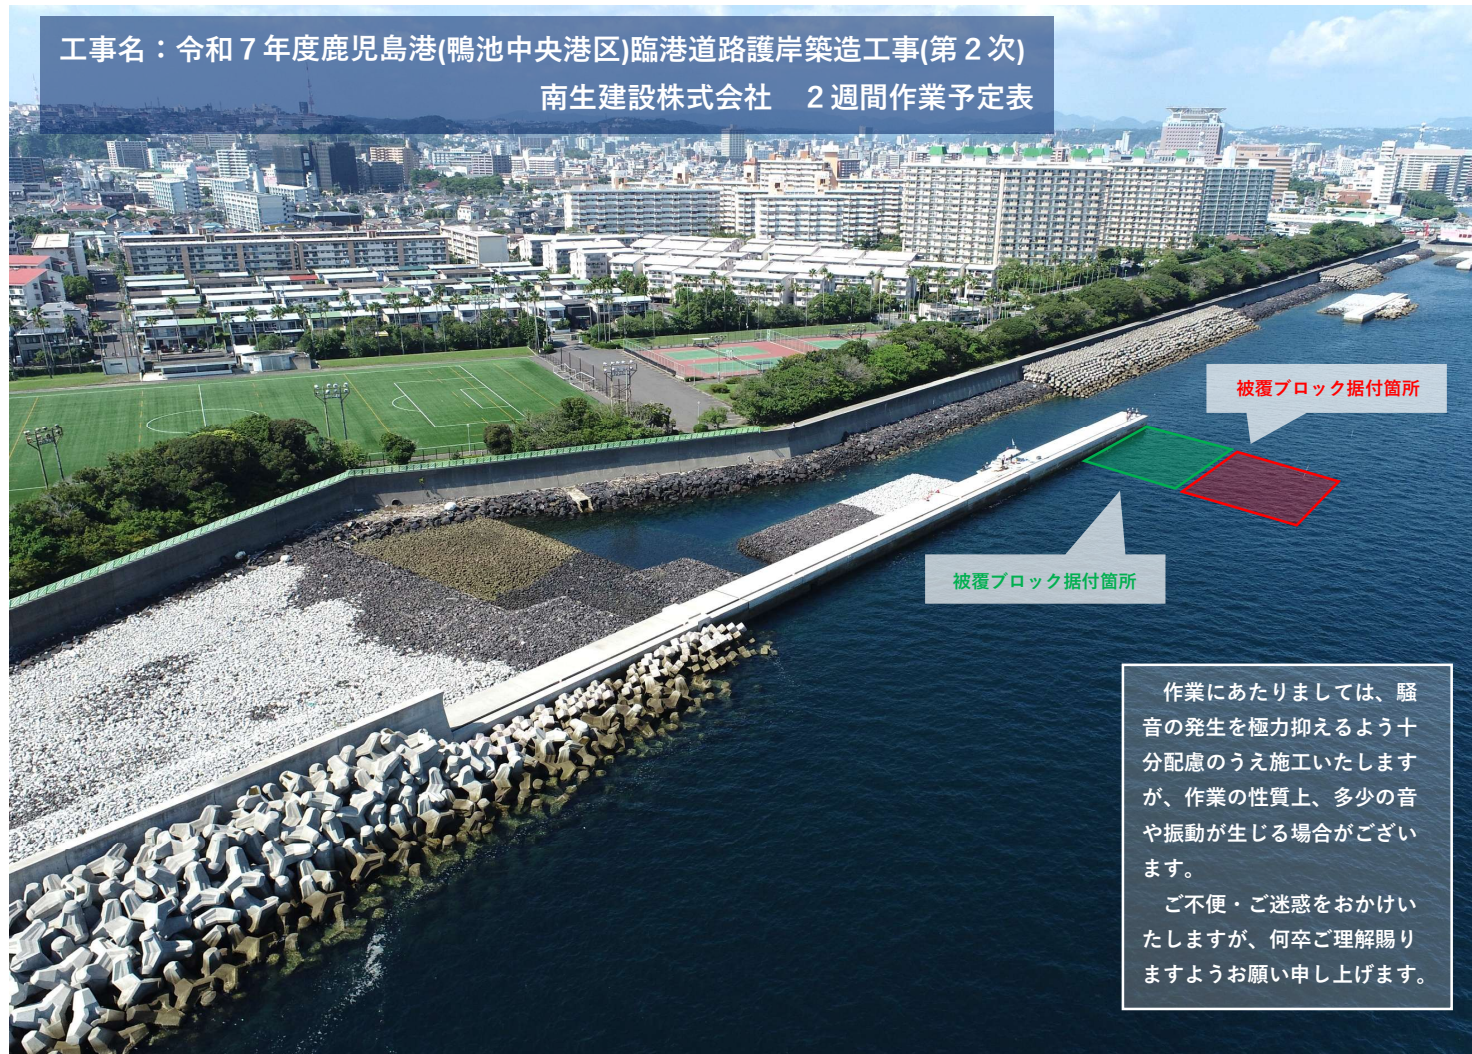

作業にあたりましては、騒音の発生を極力抑えるよう十分配慮のうえ施工いたしますが、作業の性質上、多少の音や振動が生じる場合がございます。

ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/19	月	被覆ブロック積込 (谷山港)	南港3号岸壁	10/26	月	作業なし	作業船なし
10/20	火	被覆ブロック据付	南港3号岸壁	10/27	火	休工	作業船なし
10/21	水	被覆ブロック据付	南港3号岸壁	10/28	水	被覆石投入	作業船なし
10/22	木	被覆ブロック据付	南港3号岸壁	10/29	木	被覆石均し	作業船なし
10/23	金	作業なし	作業船なし	10/30	金	被覆石均し	作業船なし
10/24	土	休工	作業船なし	10/31	土	休工	作業船なし
10/25	日	休工	作業船なし	11/1	日	休工	作業船なし
備考		作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。					

連絡先：南生建設株式会社 現場代理人（井上 050-5477-9059）

NANOY
南生建設
