


## 2週間作業予定表



### 躯体工

橋脚築造  
(躯体コンクリート打設)

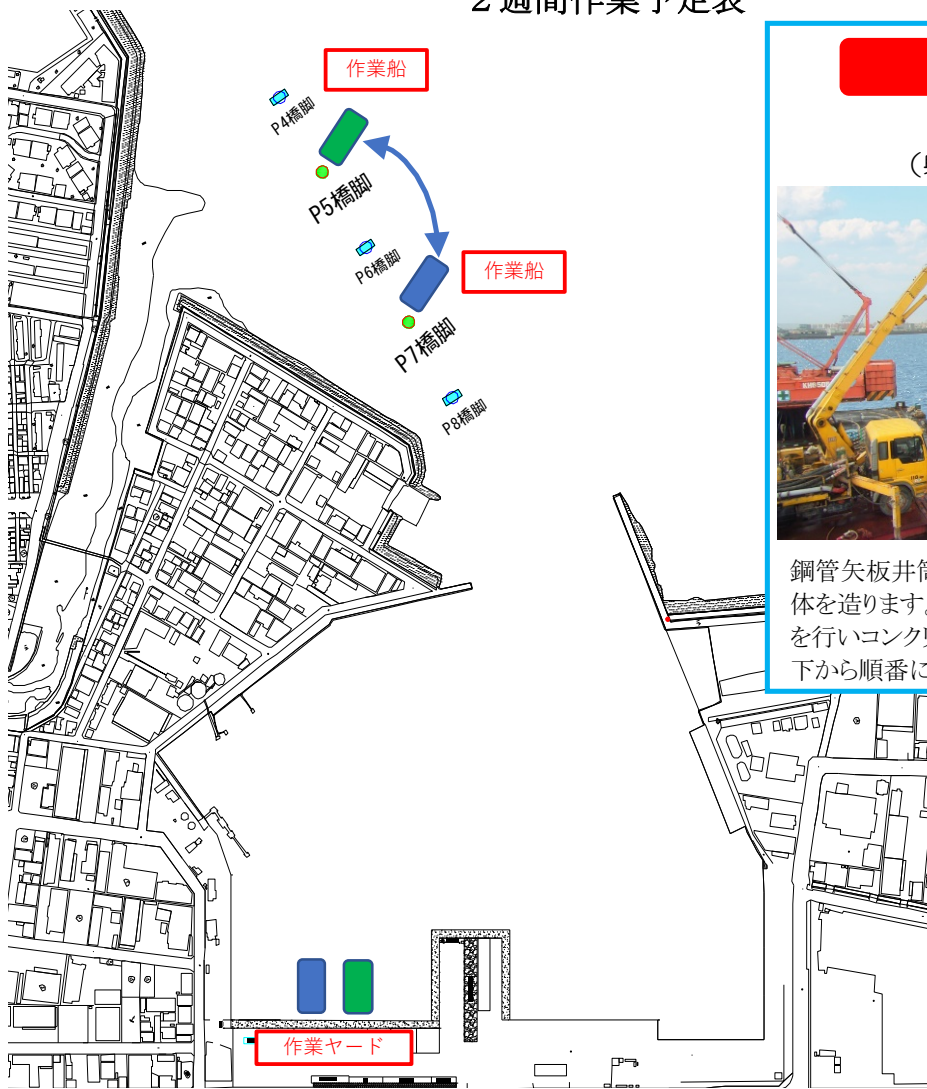

鋼管矢板井筒内に鉄筋コンクリート製の橋脚本体を造ります。足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に造り上げていきます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/22	(月)	P5：頂版鉄筋組立 P7：頂版鉄筋組立	P5→南港係留 P7係留	8/29	(月)	P5：頂版鉄筋組立 P7：頂版鉄筋組立	南港又は谷山港、旧木材港に係留
8/23	(火)	P5：頂版鉄筋組立 P7：頂版鉄筋組立	P5→南港係留 P7係留	8/30	(火)	P5：頂版鉄筋組立 P7：頂版鉄筋組立	南港又は谷山港、旧木材港に係留
8/24	(水)	P5：頂版鉄筋組立 P7：頂版鉄筋組立	P5→南港係留 P7係留	8/31	(水)	P5：頂版鉄筋組立 P7：頂版鉄筋組立	南港又は谷山港、旧木材港に係留
8/25	(木)	P5：頂版鉄筋組立 P7：頂版鉄筋組立	P5→南港係留 P7係留	9/1	(木)	P5：頂版コンクリート打設 P7：頂版鉄筋組立	P5(ミキサ船) P7係留
8/26	(金)	P5：頂版鉄筋組立 P7：頂版鉄筋組立	P5→南港係留 P7→南港係留	9/2	(金)	P5：養生 P7：頂版鉄筋組立	P5→南港係留 P7→南港係留
8/27	(土)	お休み	南港又は谷山港、旧木材港に係留	9/3	(土)	お休み	南港係留
8/28	(日)	お休み	南港又は谷山港、旧木材港に係留	9/4	(日)	お休み	南港係留
備考		天候により作業内容及び係留場所は変更有り		備考		天候により作業内容及び係留場所は変更有り	
