


2週間作業予定表

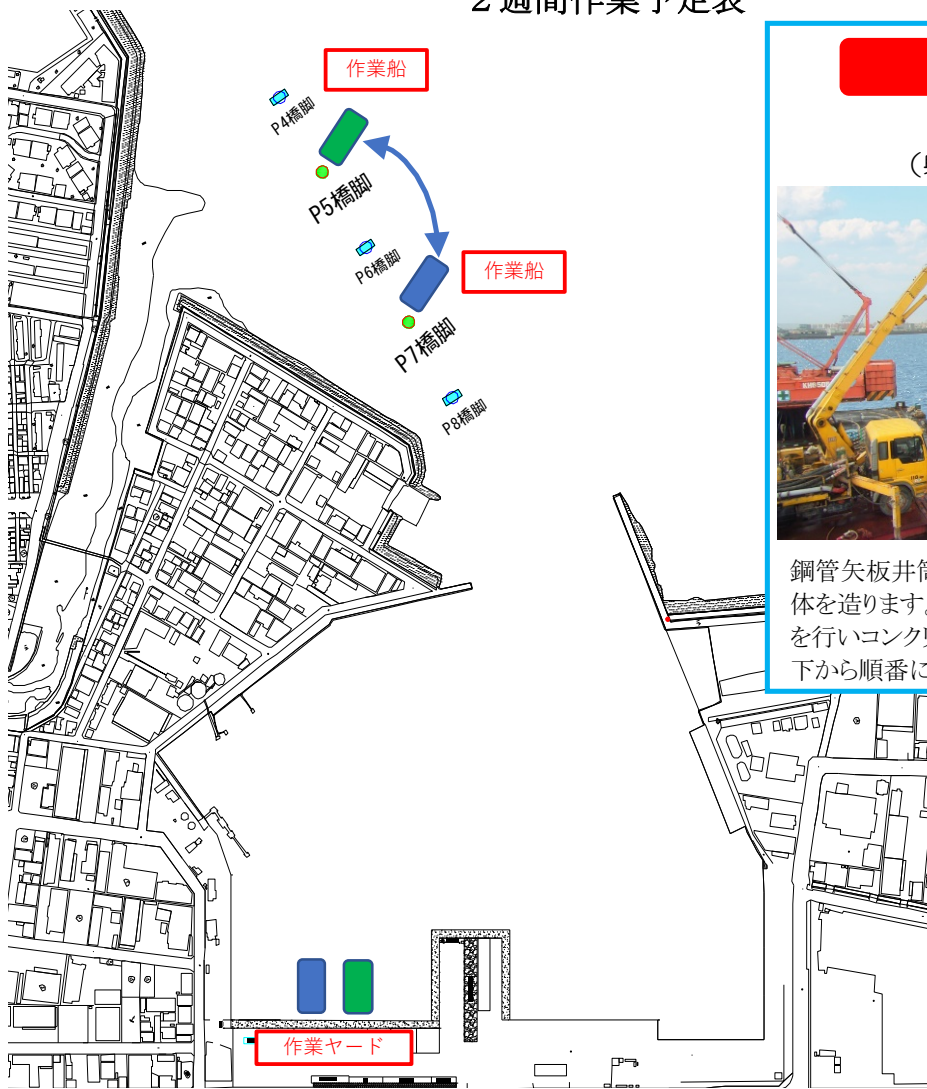

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/12	(月)	P5：型枠組立(梁部) P7：鉄筋組立(梁部)	P5係留 P7→南港係留	12/19	(月)	P5：コンクリート打設(梁部) P7：型枠組立準備(梁部)	P5係留 南港係留
12/13	(火)	P5：型枠組立(梁部) P7：鉄筋組立(梁部)	P5係留 P7→南港係留	12/20	(火)	P5：養生(梁部) P7：型枠組立(梁部)	P5係留 P7→南港係留
12/14	(水)	P5：型枠組立(梁部) P7：鉄筋組立(梁部)	P5係留 P7→南港係留	12/21	(水)	P5：養生(梁部) P7：型枠組立(梁部)	P5係留 南港係留
12/15	(木)	P5：型枠組立(梁部) P7：鉄筋組立(梁部)	P5係留 P7→南港係留	12/22	(木)	P5：養生(梁部) P7：型枠組立(梁部)	P5係留 P7→南港係留
12/16	(金)	P5：型枠組立(梁部) P7：鉄筋組立(梁部)	P5→南港係留 P7→南港係留	12/23	(金)	P5：養生(梁部) P7：型枠組立(梁部)	P5→南港係留 P7→南港係留
12/17	(土)	お休み	南港係留	12/24	(土)	お休み	南港係留
12/18	(日)	お休み	南港係留	12/25	(日)	お休み	南港係留
備考		天候により作業内容・作業日及び係留場所は変更有り		備考		天候により作業内容・作業日及び係留場所は変更有り	
